

# クリーンプラザよこて整備事業の進捗状況等について

## 1. 建設工事について

### ○ 平成25年度工事の足跡 ……造成工事

- 安全祈願祭 H25/7/31 79人が参列し、工事の安全を祈願
- 異物撤去、立木伐採 ～H25/8/10 作業小屋の撤去および立木の伐採
- 地ならし、地盤整備 H25/8/19～H25/12/10 切土、盛土、整地
- サンドマットによる地盤改良 H25/9/4～H25/9/18 敷地内搬入路部
- 沈砂池設置 仮設:H25/8/5～H25/8/19 本設置:H25/9/4～H25/9/20
- 建設用地パノラマ写真  
平成25年7月18日現在




平成25年12月10日現在



### ○ 平成26年度の工事計画

平成26年度の主な工事は焼却施設やリサイクル施設等の建物の建設工事となっております。加えまして、施設の基礎工事の進捗に合わせて、プラント機器の設置も行っております。建物に関しまして、降雪期よりも前に屋根の基礎鋼板の工事を完了したいと考えております。

現在は、焼却施設の軟弱地盤の改良を終えて、基礎工事、1階の立上り(壁)を建築中です。リサイクル施設に関しては、軟弱地盤改良工事に着手しております。

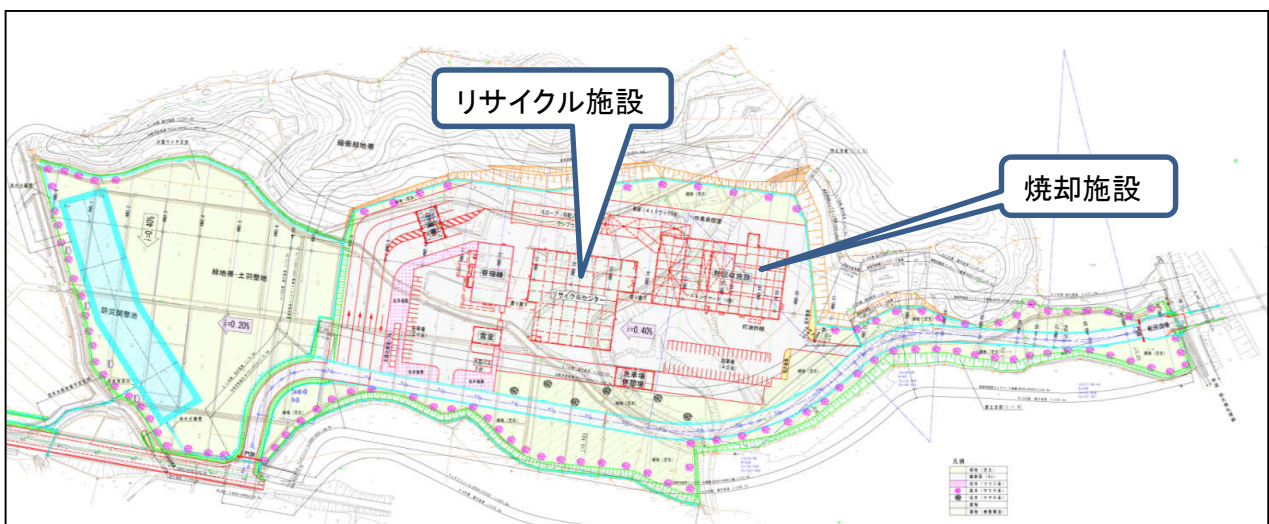

■平成26年度工事予定

平成26年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却施設 (熱回収)	土木建築	地盤改良・基礎・床		→		建屋・階層・外壁・屋根			○	煙突・建屋内部			→
	プラント			○		小・中型機器工事		→		大型機器工事			→
リサイクル施設	土木建築			○	地盤改良・基礎・床				○	建屋・階層・外壁			→
	プラント						○	→	○	破碎機・ホッパコンベア			
管理棟	土木建築							○		地盤改良・基礎・床			→


これまで通り、平成25年6月13日にさかえ市民会議、建設JV、横手市の3者で締結した工事協定書に基づき、安全・安心な工事の実施をしております。

2. 周辺環境調査について

平成26年度も例年どおり、周辺環境調査を次のとおり実施し、当環境保全委員会で結果をお知らせいたします。

- ・ 大気質調査 4地点、水質調査 4地点、底質調査 1地点、土壌調査 1地点

【調査地点の位置】

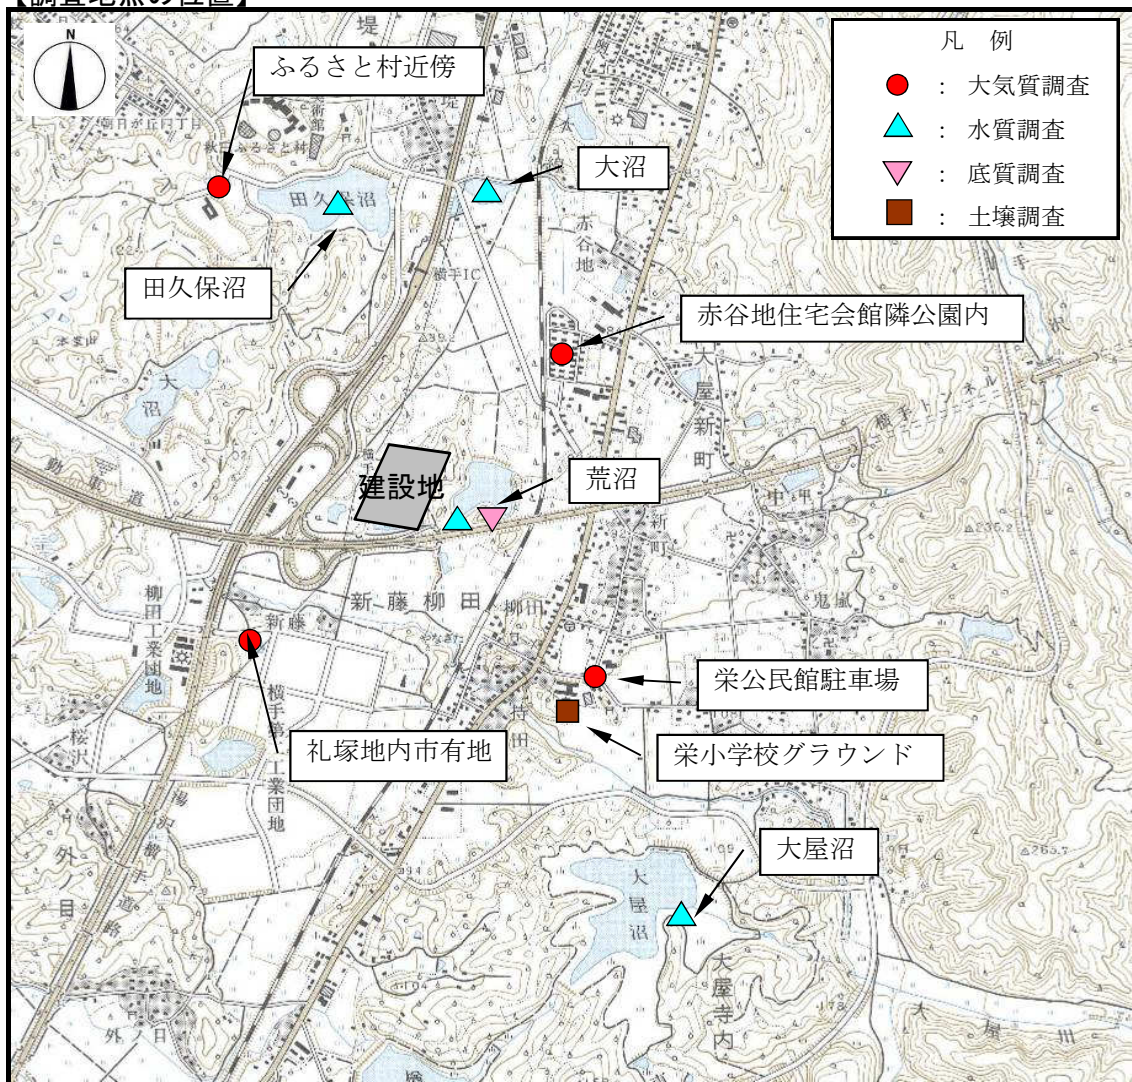

### 3. 安全対策について

#### ○26年度の整備予定箇所

##### (1) 市道堤美砂古線の整備 ①

・踏切から搬入路入口付近までの拡幅整備については、道路側溝などの拡幅工事を実施します。  
JR踏切から施設入口付近(北側搬入路)までの路線(今年度390m)

##### (2) 高速道インター出口交差点の改良 ②

・昨年度、地元水利権者のみなさん及び地区住民との協議を行って路線を確認しております。  
現在は路線測量を行っており、早急に工事着工する為の作業を行っています。

##### (3) クリーンプラザよこて搬入道路の整備

・北側搬入路 平成27年度クリーンプラザよこて完成時まで道路舗装工事を完成③  
・南側搬入路 今年度平成26年度中、道路工事完成予定 ④  
工業団地内の交差点への停止線設置については、市の担当と協議して今年度実施する予定です。

##### (4) 栄地区町内の通学路・生活道路の整備

・中野団地8号線 他 ⑤  
・平林寺内線 ⑥



#### ○交通安全協会栄支部役員との協議状況

(1) 大堤町内入口交差点への信号機設置  
地元の要望があった信号機新設については、市の27年度要望として警察に申請します。  
今後も申請を継続して行ってまいります。 ⑦

(2) 栄地区への看板の設置  
昨年度は2箇所でしたが、必要な個所があれば設置してまいります。

## 【計画予定箇所の周辺地図】

