

クリーンプラザよこて 建設工事だより

第4号

■発行者■

横手市役所市民生活部
生活環境課（横手市中央町8-2）
Tel 0182-35-2184
Fax 0182-33-7838
E-mail kankyo@city.yokote.lg.jp

平成26年1月1日発行

あけましておめでとうございます！

平成25年7月から始まったクリーンプラザよこての建設工事は、着手から半年が経過しました。着工時から進めていた建設用地の造成工事は平成25年12月10日で完了し、今は平成26年3月から始まる建築工事の準備を進めています。今後も安全・安心な工事を進めてまいりますので、何卒ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。


○建設用地の状況（平成25年12月10日現在）



～熱回収施設について～

平成26年3月から建築を開始する熱回収施設は、市から集まった可燃ごみを焼却し、そこから取り出した熱を使って発電を行う施設です。

直接資源としてリサイクルすることができない可燃ごみも、熱回収によりエネルギーとしてリサイクルすることができます。クリーンプラザよこては施設の稼働に必要な電力のほとんどをこの発電によりまかなうことが可能です。より環境にやさしい施設を目指して工事を進めています。

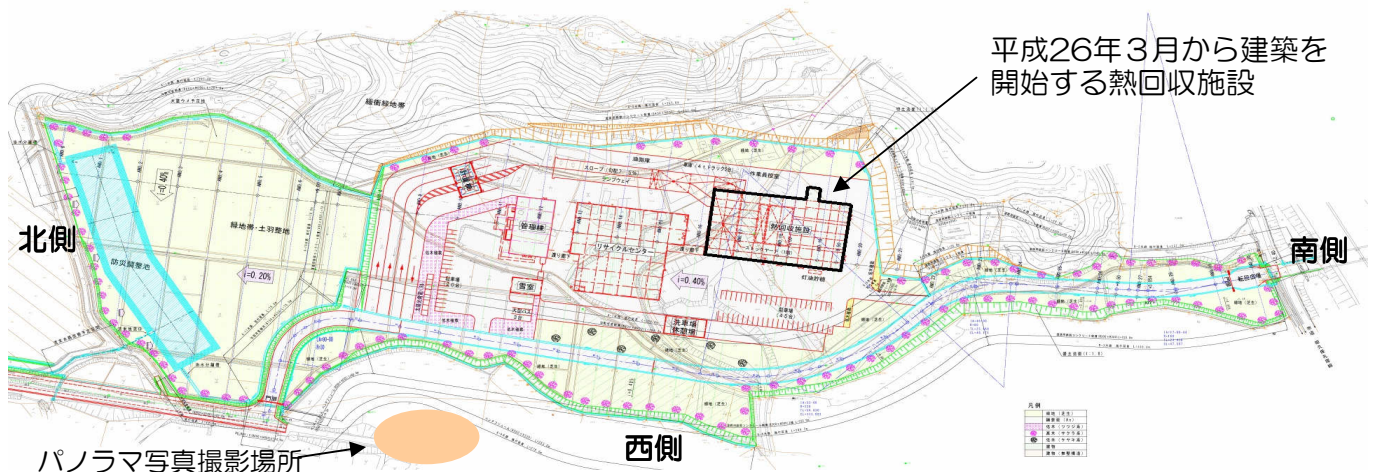

平成26年3月から建築を開始する熱回収施設

裏面に続きます⇒

○工事進捗状況（平成25年12月10日現在）



南側搬入路（第二工業団地側）の状況写真です。舗装が進み、交差点の周辺も整備し直すことで、搬入車両がより安全に進入できるよう準備を進めています。



北側搬入路（堤美砂古線側）の状況写真です。草地だった部分を舗装し、大型の車両もスムーズに進入できるようになります。

○工事スケジュール

建設工事のおおまかなスケジュールをお知らせします。

		2月		3月			4月		
		中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
準備工（施設内除雪）			→						
建築工事（熱回収施設）				ごみピット掘削		ごみピットコンクリート打設			
外構工事							防災調整池工事		
工事 出 入 車 両	バックホウ		0.6 ^m ³/2台						
	トラクタ 20t		→						
	ダンプトラック 10t			→					
	生コン車 10t					→			

※建設用地での休工に伴いこの「工事だより」も休刊します。第5号は4月15日発行予定です。

「クリーンプラザよこて建設工事だより」は、栄地区の皆さんにお届けするほか、栄公民館、各地域局にも置いています。また、市ホームページにも掲載していますので併せてご覧ください。

ご意見・ご質問は下記へお寄せください。

●横手市市民生活部 生活環境課 電話35-2184 FAX33-7838

ホームページ <http://www.city.yokote.lg.jp> ページ番号 000016067

E-mail kankyo@city.yokote.lg.jp
