

クリーンプラザよこて

建設工事だより 第14号



施設完成予想図

■発行者■ 横手市役所市民生活部 生活環境課
■発行日■ 平成26年12月15日

～クリーンプラザよこて建設工事の進み具合をお知らせします～

施設部分写真（5月1日）



施設部分写真（12月1日）



施設の建設用地について、現場の雪が融けた平成26年5月1日時点と12月1日時点での写真を比較しました。

この間、造成工事として構内道路の舗装を行ったほか、施設本体工事については柱状改良による地盤の補強後に熱回収施設の建設に着手し、ストーカ式焼却炉をはじめとした主要な設備の搬入・据え付けを行いました。

熱回収施設の状況① ～煙突について～




地上から撮影。煙突の付け根部分の工事が進んでいます。

煙突の高さは地上高59メートルで、航空法による昼間障害表示（煙突を赤白に塗装する）が必要のない高さとなっており、景観に配慮したつくりとなります。

裏面に続きます⇒

熱回収施設の状況② ～ごみ投入口について～

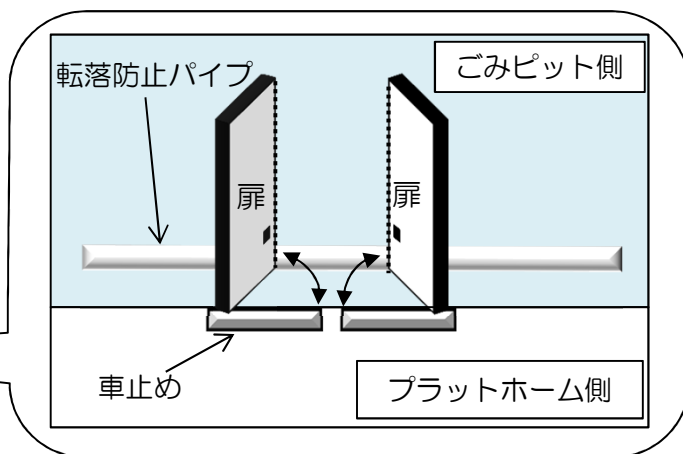

ごみの投入口の現在の様子です。投入されたごみはごみピットに入り、クレーンによって破袋・攪拌された後ごみ投入ホッパと呼ばれる部分に運ばれます。

投入口下部には車止めがあり、車両が転落しないよう設計されています。中心にはこぼれ落ちたごみを掃いて投入するためのスペースが設けられています。



写真は他自治体施設のものですが、ほぼ同様の扉が設置されます。扉は内側（ごみピット側）に開閉し、万が一車両が車止めを越えて転落してしまった時のために転落防止パイプも設けられています。
 扉の色はオレンジ色で、市章に使われているものと似た色が用いられます。

この部分の色に近いものを使用



「クリーンプラザよこて建設工事だより」は、栄地区の皆さんにお届けするほか、栄公民館、各地域局にも置いています。また、市ホームページにも掲載していますので併せてご覧ください。
 ご意見・ご質問は下記へお寄せください。
 ●横手市市民生活部 生活環境課 電話35-2184 FAX33-7838
 ホームページ <http://www.city.yokote.lg.jp> ページ番号000016067
 E-mail kankyo@city.yokote.lg.jp
