

## 対策一覧表

### 【朝倉小学校】


番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	実施状況	実施内容等	R8以降の予定
1	主要地方道大曲横手線	八幡字十二柳	時期によって流れが速く、危険である。柵が所々破損している。	転落防止柵の交換	県	完了	転落防止柵交換済（H27）	
2	市道朝倉線	朝倉町 睦成踏切付近	道幅が狭く、特に冬場は歩行危険である。H24合同点検実施。	①歩道の設置 ②踏切の改修（睦成踏切）	①②市	①完了 ②完了	①歩道設置完了（H28） ②踏切部拡幅改良工事実施済（H28）	
3	市道朝倉線	碓大橋～薬王堂横手幸町店前交差点	道幅が狭く、交通量が多く危険である。交差点も変則で危険である。	①交差点の改良 ②道路の拡幅	①県 ②市	①完了 ②完了	①交差点改良完了（H27） ②改良拡幅・白線施工工事実施済（H27）	
4	朝倉サイクリングロード線ほか	横手大鳥公園内道路	街灯が少なく以前にも不審者が出たことがあり危険である。	①補助灯具の設置 ②照明灯具のLED化 ③公園内の樹木の枝払いの実施	①②③市	①完了 ②完了 ③完了	①デザイン灯添架設置済（H27） ②照明灯具のLED化済（H28）	③毎年実施予定
5	市道台所2号線	新坂町 公文書館横	見通しが悪く危険である。転落のおそれあり。人気が少ない、道が狭い。暗く単独で下校すると危険である。	①児童への交通安全指導 ②照明灯具のLED化 ③路肩の補強 ④ガードレールの補修 ⑤除草	①学校 ②③④⑤市	①実施中 ②完了 ③完了 ④完了 ⑤完了	②照明灯具のLED化済（H28） ③路肩の補強実施済（H30） ④ガードレール補修実施済（H30） ⑤除草実施（H30）	①継続指導
6	県道大曲横手線	横手市静町	横断歩道はあるが、交通量が多いため、横断する際非常に危険である。児童のたまり場が少なく危険である。（横手北小関連）	①県道に設置してある誘導ポールを車道側に移動 ②滞留のためのライン標示の検討	①②県	①完了 ②完了	①誘導ポール移設済（H27） ②ライン標示設置済（H27）	
7	市道駅北線	広場周辺十字路	上真山の五差路から関根町内の十字路まで横断歩道が無く、児童が道路を横断する際に大変危険。	横断歩道の新設	警察	完了	利用者数、利用目的など総合的に判断し新設は不可。代替策として、警察でミニ看板の設置済。（R4）	

【朝倉小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	実施状況	実施内容等	R8以降の予定
8	市道駅北線	関根町会館付近	ガードレールが曲がって傾いていて危険である。	ガードレールの補修	市	完了	ガードパイプ交換、補修実施済（H30）	
9	市道朝倉町大鳥井山下線	朝倉小学校グラウンド周辺	ゆるい坂道の横に深い側溝があり、蓋や柵がない。児童が足を踏み外すと大怪我になる可能性があり、大変危険である。（大事には至らなかつたが、実際に落ちた児童が複数いる。）	ガードレール等の設置または側溝の蓋がけ	市	完了	着脱式ガードパイプを設置済（H30）	
10	市道新坂七日市線	公文書館前	周辺の塀等により見通しが悪く、児童の横断に危険である。	①横断歩道の新設 ②学校での指導	①警察 ②市→学校	①実施なし ②実施中	①退避スペースが無く、設置不可。 ②学校での指導（R2～）	②学校指導
11	市道新坂七日市線	大鳥町 民家塀	民家の塀が傾いていて危険である。	塀の補修等を促す	市→学校	実施なし	R2より継続要望 学校での指導（R6～）	学校指導
12	県道横手停車場線	国道13号～市道駅北線	国道13号から踏切付近まで、県道を横断する児童がいるがおり、交通量が多く横断歩道の待機場所も無く危険である。	歩道設置（R2）	県	実施中		県で事業実施中
13	県道272号	杉沢橋付近	交通量が多く県道を横断するのが危険である。	横断歩道の新設	警察	完了	【R3】設置済	
14	市道朝倉線	睦成踏切～碓橋	交通量が多く道幅が狭い。	ゾーン30の設定	警察	完了	【R5】エリア拡大設置済	
15	県道272号	追廻付近	スピードを出している車が多い	スピードの低減	警察	完了	速度制限の注意啓発活動を実施	継続実施（注意啓発活動）

# 横手市立朝倉小学校

# 通学路合同点検位置図

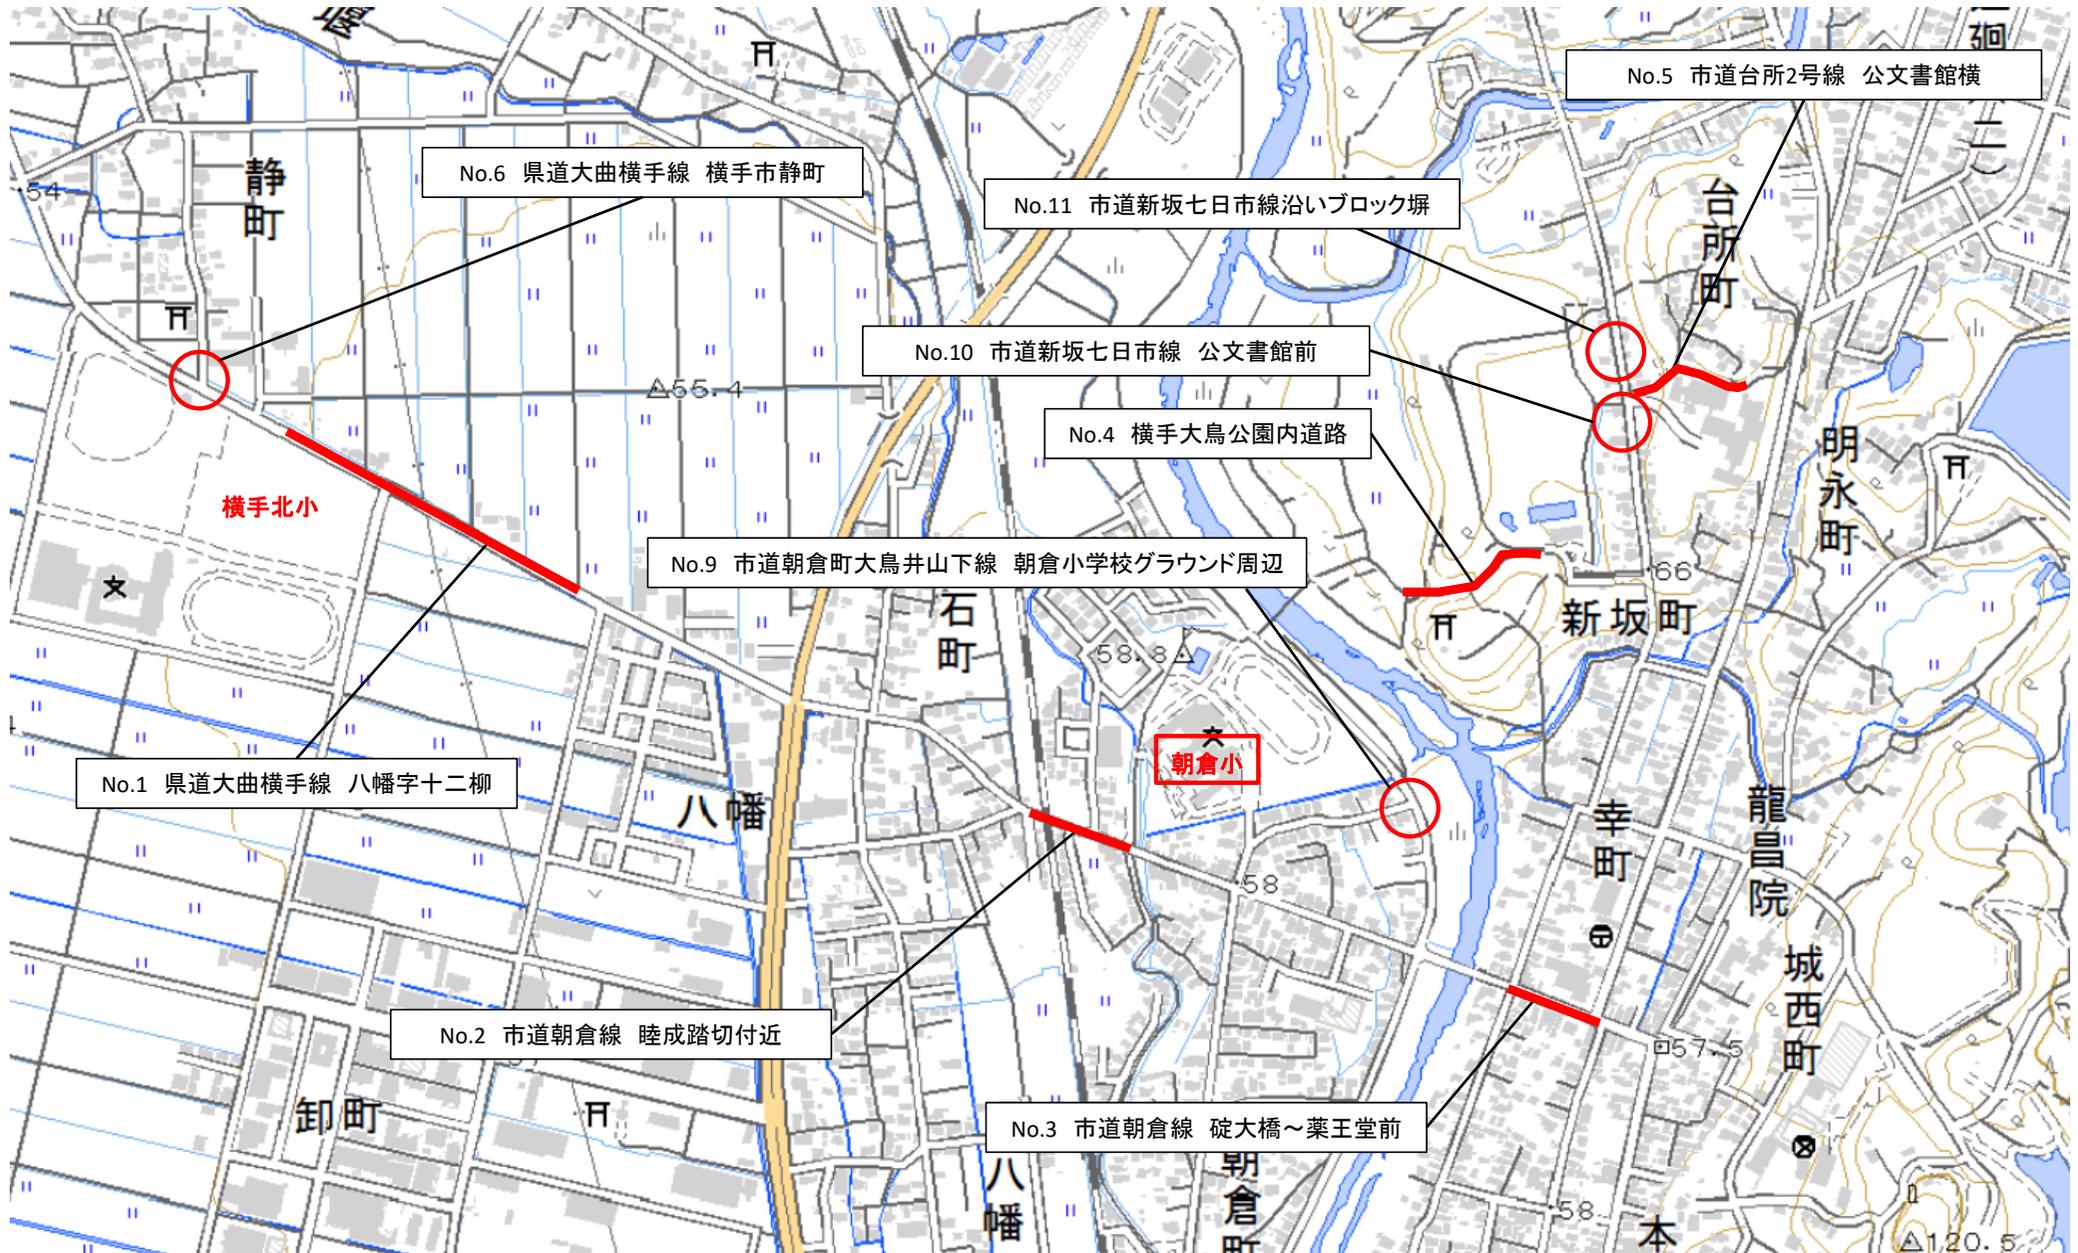

# 横手市立朝倉小学校

# 通学路合同点検位置図

