対策一覧表


【栄小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	実施状況	実施内容等	R8以降の予定
1	国道13号	外目・持田近物レックス付近	冬季に歩道除雪が遅れると車道歩行となり危険である。	除排雪作業の徹底	国	完了		継続実施
2	市道新町鬼嵐線	中里・寺村地内	雨量が多くなると通学路が冠水し、歩行不能となる。	関係機関（土地改良区）と協議のうえ対応を検討	市	完了	現地の状況を確認したところ、圃場整備が行われ、水路も整備されており、現状対策不要とした。（R4）	
3	市道新町鬼嵐線	大屋寺内・堀ノ内	用水路に蓋がないため、冬季転落の危険ある。	部分的な側溝蓋設置の検討	市	完了	グレーチング設置済（H27）	
4	市道平林寺内線	大屋寺内地内	水田と道路の高低差が少ないので、豪雨の時には冠水して歩行困難となる。	関係機関（土地改良区）と協議のうえ対応を検討	市	完了	現地の状況を確認したところ、圃場整備が行われ、水路も整備されており、現状対策不要とした。（R4）	
5	市道堤美砂古線	大屋新町字中野	融雪時期の排水方向に残雪があるなど悪条件が重なった折に一時的に歩道部分に水たまりができて水路部分との境界が分かりにくくなることがある。	今冬の状況を確認し、必要に応じて検討。	市	実施中		継続して状況を監視
6	県道金沢吉田柳田線	柳田字八郎小屋	交差点に向かって右側歩道の山寄りの土留めが傷んでいて危険である。	①擁壁上の支障木の伐採 ②児童への交通安全教育（反対側通行）	①県 ②学校	①完了 ②実施中	①支障木の伐採実施済（H27）	②継続実施
7	国道１３号	柳田字持田から大屋新町字新町	歩道が狭く通行に支障をきたしている。降雪期は特に狭くなる。	①歩行者空間の安全確保 ②交差点内の安全対策（グリーベルト設置等）	①②国	①実施中 ②完了	①用地買収、歩道整備実施中 ①②減速、注意喚起路面標示（ドットライン等）の設置（R5） ②グリーンベルト設置（H28）、グリーンベルト再塗装済（R6）	①継続実施
8	市道堤美砂古線	美砂古交差点	国道と市道の交差角が厳しく、朝夕の通勤時には渋滞が発生している。通学路としては、視認性に問題があると思われる。 沼と歩道境に雑草が生えるため、歩道が狭くなり危険である。	①市道線形改良 ②交差点内の通学歩行者の安全確保 ③定期パトロールによる管理の徹底	①市 ②③国	①検討中 ②実施中 ③実施中	②グリーンベルト再塗装済（R6）	①継続検討 ②継続実施 交差点内の安全対策（横断歩道・グリーンベルトの再塗装） ③定期パトロールにより状況を把握する。


【栄小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	実施状況	実施内容等	R8以降の予定
9	市道堤線	大屋新町字牛首戸地内	道幅が狭く、通勤等の車の往来が多い。	①拡幅改良 ②外側線の塗装 ③歩行者スペースの確保	①②③市	①検討中 ②完了 ③検討中	②外側線、グリーンベルト設置済（R5）	①継続検討 ③歩行者スペースの確保
10	県道金沢吉田柳田線	横手第二工業団地付近交差点	道幅が広く、トラックなどの大型車両の往来が多い。	横断歩道の新設	警察	実施なし	設置不可（横断者数が少ないため。）	
11	市道平林寺内線	大屋新町地内 （国道13号線十字路前）	路側幅（徒歩部分）が狭く、児童の登下校に危険である。	①路側幅の拡幅 ②児童への交通安全教育 ③安全地帯の確保の拡充	①市 ②学校 ③市	①実施なし ②実施中 ③検討	①路側幅の拡幅不可（グリーンベルト等設置で対応） ②児童への交通安全教育（R6～） ③グリーンベルトの延長	①グリーンベルト等再塗装実施 ②交通安全指導継続 ③グリーンベルト延長の検討
12	市道持田団地線	国道13号線持田会館～持田踏切～第２工業団地手前	国道１３号線持田会館から持田踏切を通り，第二工業団地に向かう車が多い。通勤時間と通学時間が重なり，道幅も狭く危険である。	①道路の拡幅（歩行者用エリアの確保） ②除雪の徹底 ③学校指導	①②市 ③学校	①検討中 ②完了 ③実施中		①継続検討（R2～） ②継続実施（R2～） ③学校指導（R2～）
13	市道新町鬼嵐線	大屋寺内堀ノ内 （新町村中１号線との突き当り付近）	路肩に傾斜があり，側溝に蓋が無く危険である。	側溝に蓋（グレーチング）の設置	市	検討中		継続検討
14	市道美砂古新町線	変則十字路	変則十字路で見通しも悪く危険。	変則十字路の解消	市	完了	早々に道路改良は困難なため、優先道をわかりやすくするため、ドットライン設置済（R4）	
15	国道13号線	大堤高速入口の地下道	雨の日に、タイルが滑って危険である。	塗膜タイプの滑り止めを施工	国	完了	実施済（R2）	
16	市道新町平林線	大屋新町字仏ヶ沢	路幅が狭く、歩道と車道の境目がない。	外側線の設置	市	完了	外側線設置済（R5）	

横手市立栄小学校　　通学路合同点検位置図

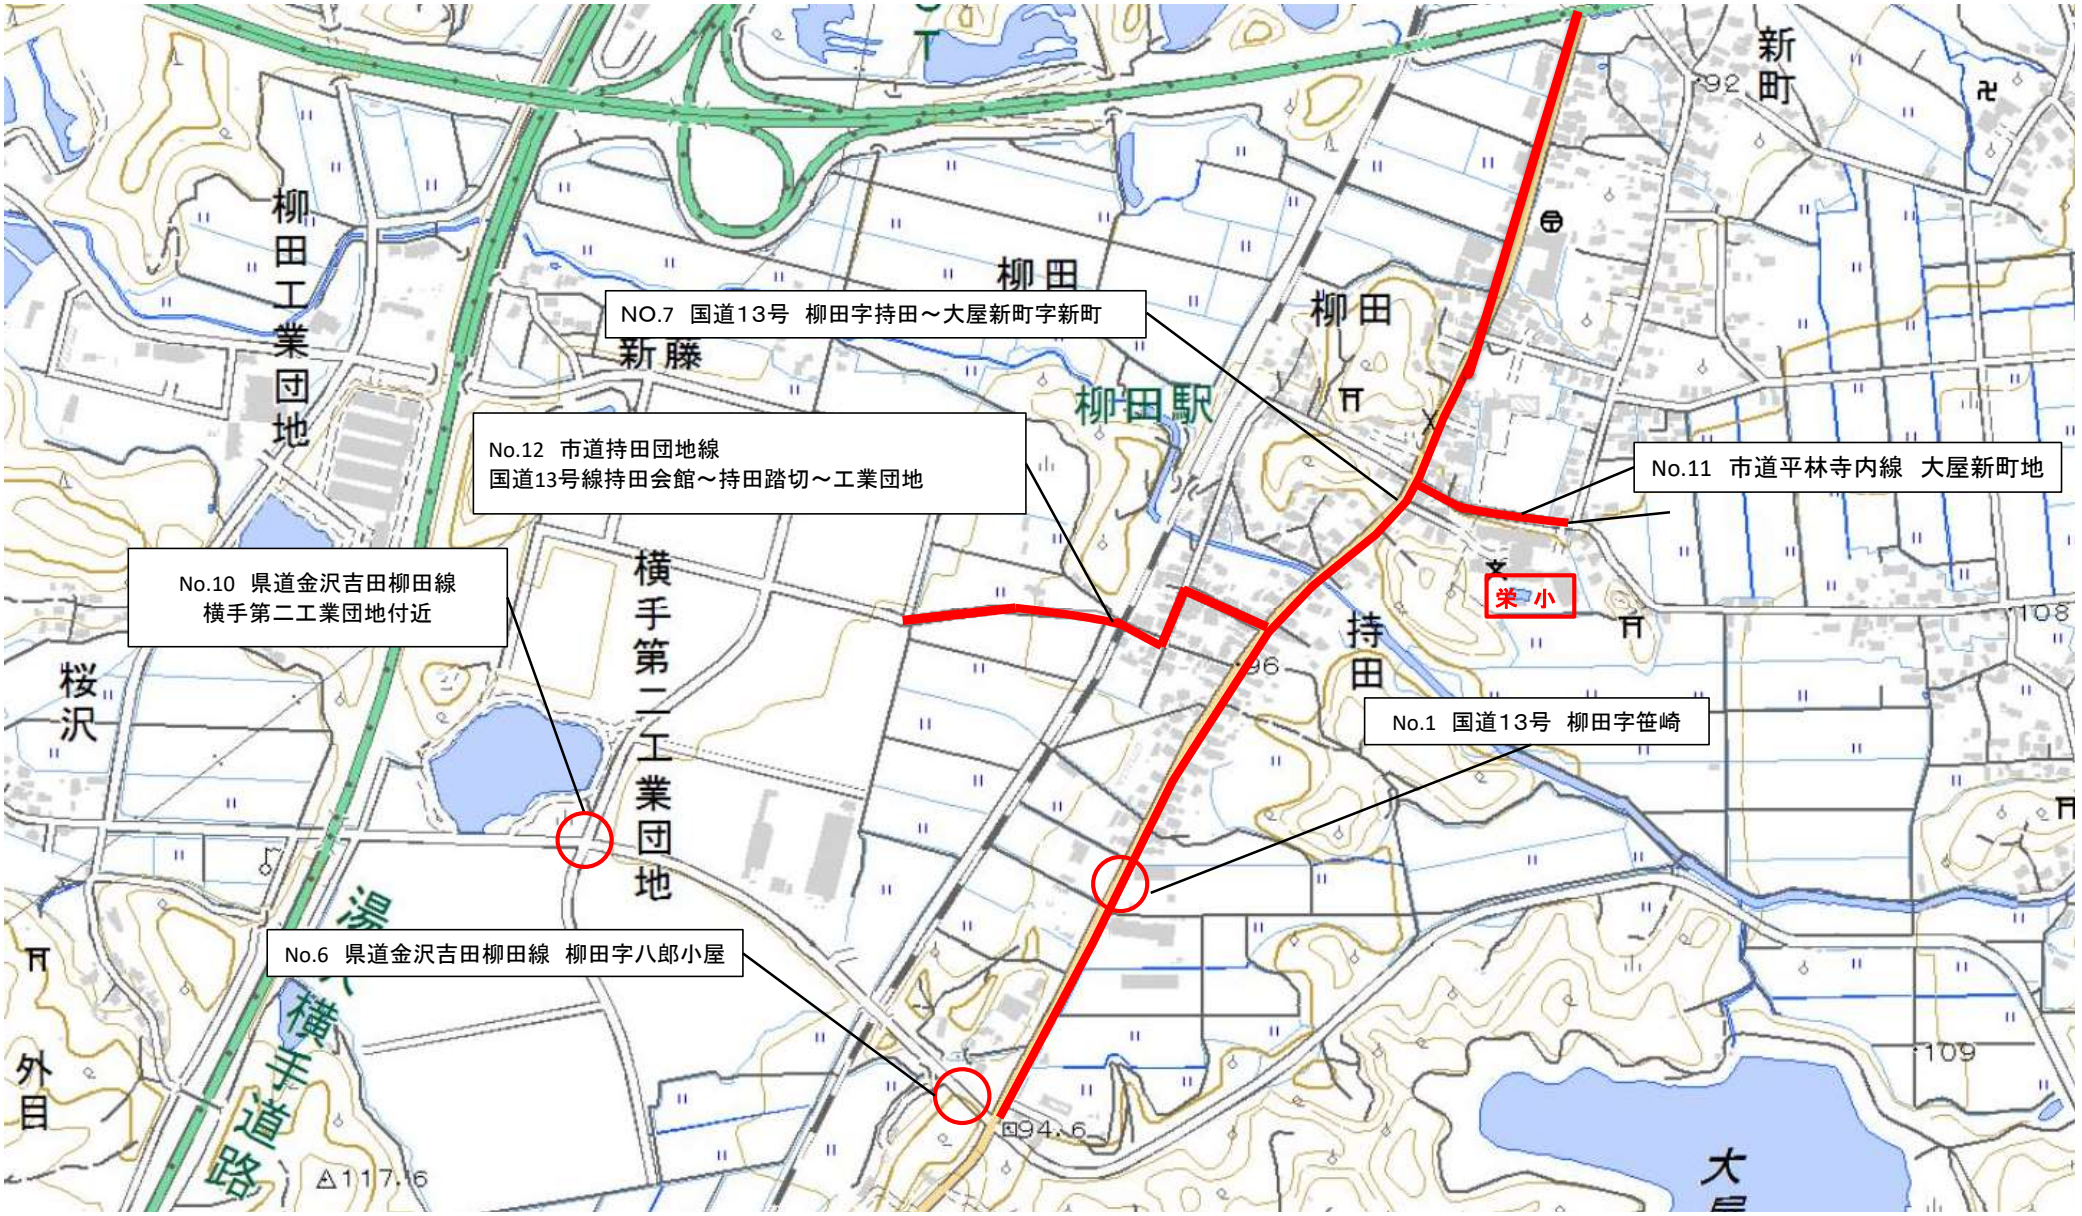

横手市立栄小学校　　通学路合同点検位置図

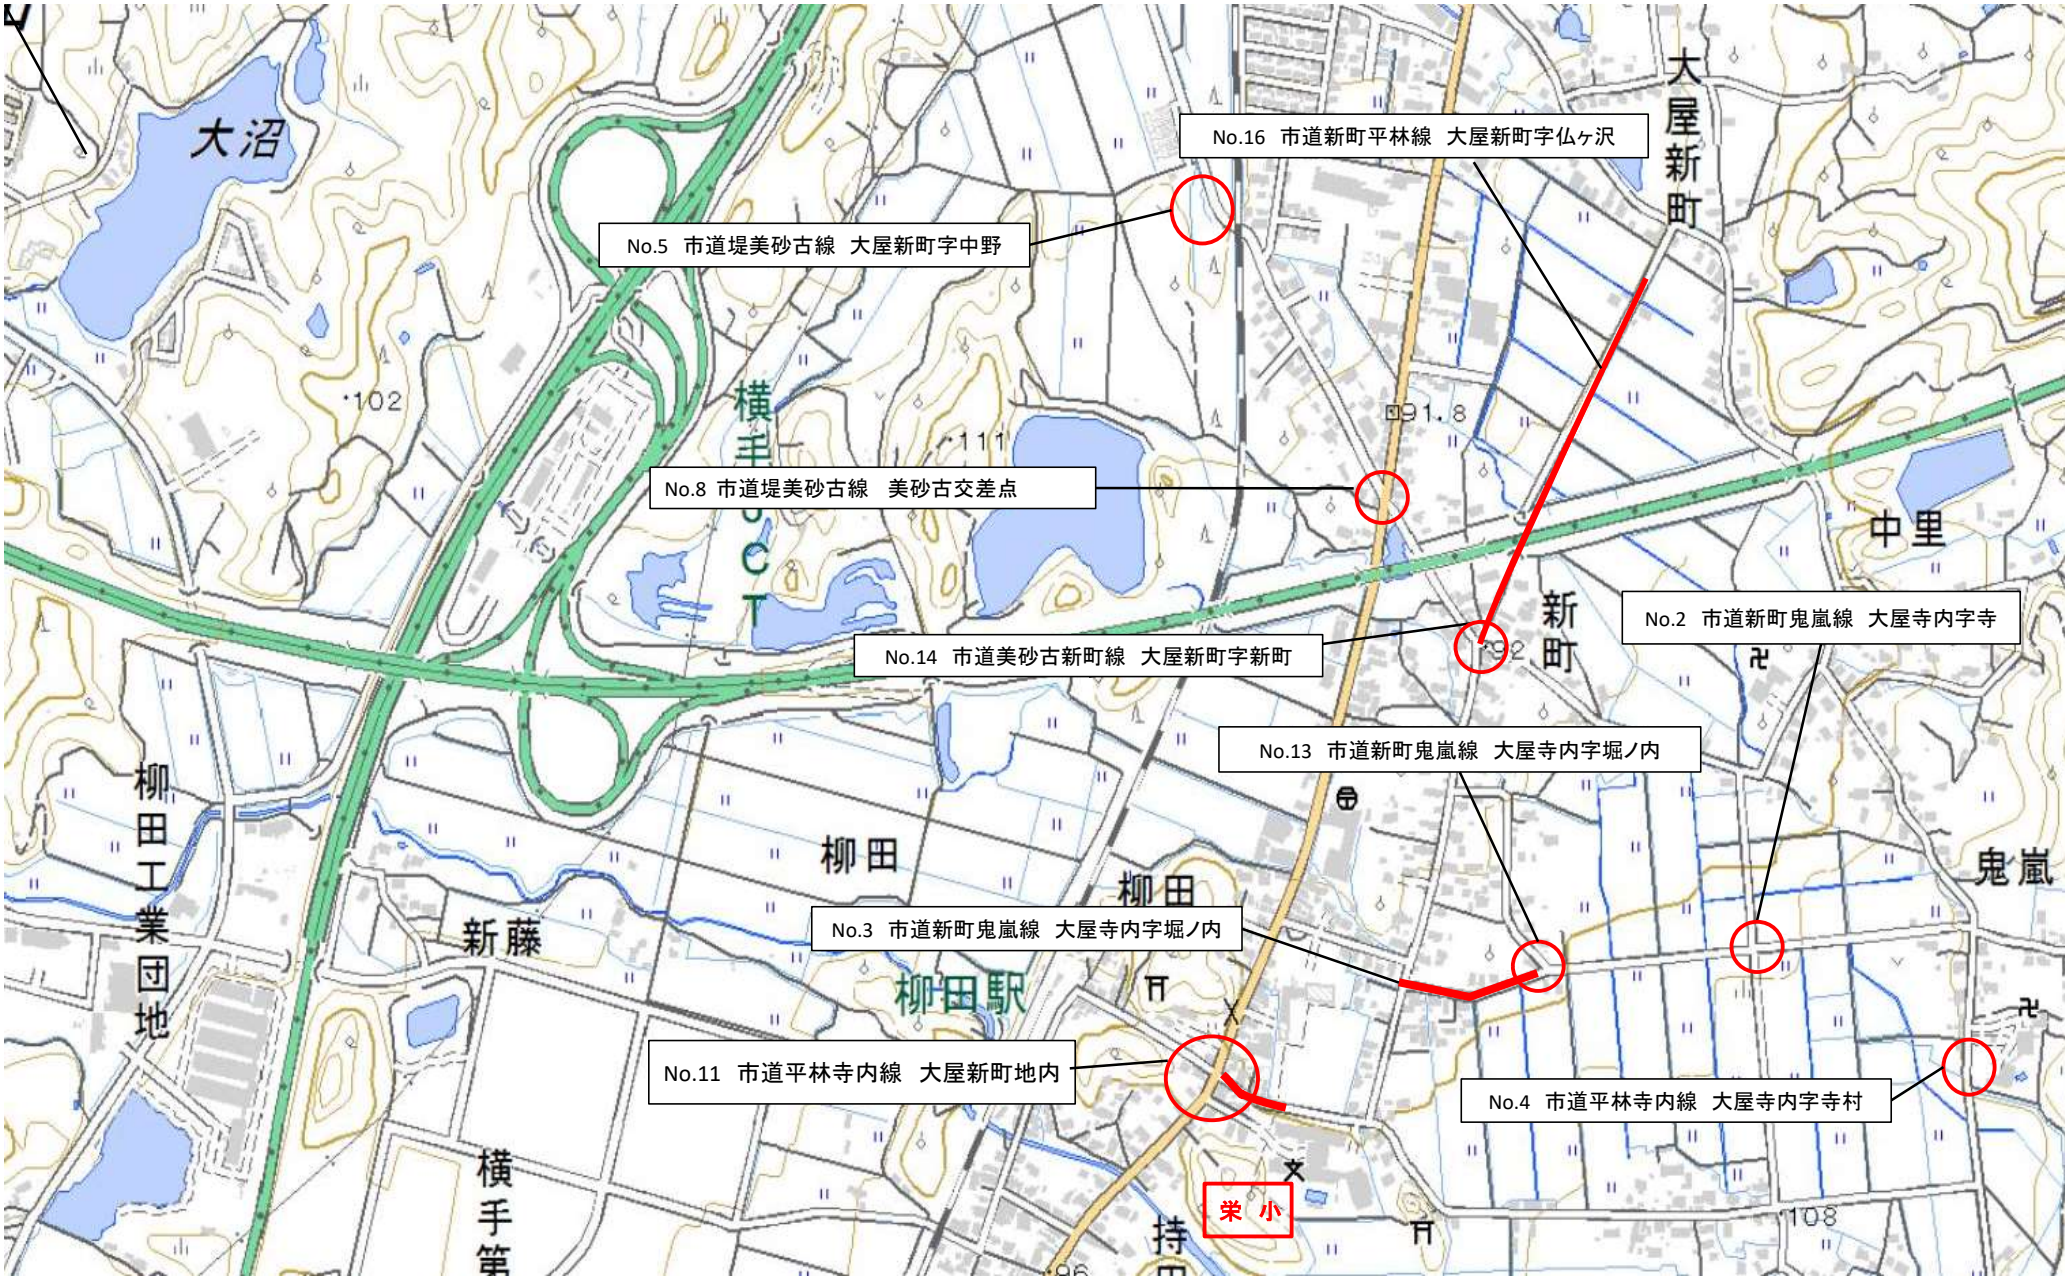

横手市立栄小学校　　通学路合同点検位置図

