対策一覧表

【醍醐小学校】


番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	実施状況	実施内容等	R8以降の予定
1	国道１３号	醍醐字大橋	学校側の階段の上半分の融雪線が故障しており雪が溶けない。	①道路パトロールの強化 ②センサーの調整	①②国	①完了 ②完了	②センサー修繕済（H27）	①継続実施
2	県道川連増田平鹿線	①②醍醐字石成	道幅が狭く、歩道もない。 国道13号線歩道との接続箇所、塀と縁石との間が狭く冬期間は危険である	①歩道の設置 ②除雪の徹底	①②県	①完了 ②完了	①道路工事完了（R3）	②継続実施
3	市道大橋田町線	醍醐字三嶋	道幅が狭く、歩道もない。	①樹木等の枝葉の剪定 ②関係機関による安全対策の検討	①②市	①実施中 ②完了	②路面標示（ドットライン）設置済（H27）	①継続要望（一部実施済）
4	市道金屋107線	醍醐字金屋	道幅が狭く、歩道もない。 立木が視界を狭くしている。	①注意看板設置等の検討 ②関係機関による安全対策の検討	①②市	①検討中 ②完了	②路面標示（ドットライン）設置済（H27）	①継続検討
5	市道大橋田町線	醍醐字太茂田（踏切）	道幅が狭く、歩道もない。	踏切前後の落下防止対策の検討	市	完了	防護柵設置済（H28）	
6	市道三嶋馬鞍線	醍醐字馬鞍地区	側溝がむき出し・道が狭い・狭い三叉路。 ※①～④は馬鞍地内三叉路、⑤は黄龍寺山門付近	①交差点への側溝蓋の設置検討 ②交差点への路面標示（グリーン帯）の設置検討 ③交差点付近の樹木の剪定 ④三叉路への赤色カラー舗装の実施 ⑤路側帯にある電柱の移設	①②④⑤市 ③地域	①完了 ②完了 ③完了 ④完了 ⑤実施なし	①グレーチング設置（H28） ②ドットライン設置（H28） ③樹木剪定実施済（H29） ④カラー舗装完了（R6）	⑤実施なし
7	市道大橋田町線 市道阿弥陀田村中1号線	平鹿町醍醐字三嶋地区～阿弥陀田地区	堰がむき出しで深い。	①路面標示（外側線）幅の拡幅とグリーンベルト標示の検討 ②転落防止柵等の設置検討 ③児童への交通安全教育	①②市 ③学校	①完了 ②完了 ③実施中	②転落防止柵設置（H28） （この設置により、 ①は実施予定なし。）	③継続実施（交通安全指導）
8	国道１３号	醍醐地区（醍醐交差点～大橋交差点）	路肩が狭く降雪期における歩行者空間が確保されていない。	歩道整備	国	完了	歩道整備完了（R5）	

対策一覧表


【醍醐小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	実施状況	実施内容等	R8以降の予定
9	市道金屋１０７線	醍醐字荒処地内	道路幅が狭く、朝夕の交通量が多く、歩行の際に危険である。	路面標示（ドットライン）の設置	市	実施なし	道路幅狭小のため、実施予定なし。	
10	市道金屋１０７線	樋ノ口集落内	道路幅が狭く、朝夕の交通量が多く、歩行の際に危険である。	路面標示（ドットライン）の設置	市	実施なし	道路幅狭小のため、実施予定なし。	
11	市道大橋田町線	醍醐字釜ノ川地内	道路幅が狭く、朝夕の交通量が多く、歩行の際に危険である。	路面標示（ドットライン）の設置	市	完了	路面標示（ドットライン）設置（H30）、外側線再塗装済（R2）	
12	国道１３号	大橋交差点	大橋交差点ハ交通量が多く浅舞ー醍醐方面で右折待ちをする車とスピードを出して直進する車との衝突が常に危惧される。	①ガードパイプとガードポールの設置 ②ガードポールは除雪を考慮し冬場取り外しする為、児童へガードパイプへの退避を指導する	①国 ②学校	①完了 ②実施中	①ガードパイプ・ポール設置済（Ｒ１）	②継続実施（交通安全教育）
13	県道川連増田平鹿線	醍醐字石成踏切～野中町内	歩道がなく路側も狭い通学路。 見通しがよくスピードが出やすい。	①車両の減速及び注意喚起のため外側線にドットライン設置 ②速度制限の新設	①県 ②警察	①完了 ②完了	①路面標示（ドットライン）設置設置（R2） ②速度制限40キロ新設（R4）	
14	県道浅舞醍醐線	醍醐字上醍醐（高速道下）	湯沢横手道路の真下。降水時、水が溜まり通学の支障となっている。	歩道のくぼみの解消と路肩側溝蓋をグレーチングへ取替	市	完了	歩道のくぼみ舗装、路肩側溝蓋をグレーチング取替（R1）	
15	県道浅舞醍醐線	醍醐字（醍醐郵便局・十文字湯沢方面へのＴ字路）	朝夕の交通ラッシュ時における交通量が多く，横断歩道がないため危険である。	①-1横断歩道の新設，または①-2横断用黄旗の設置	~~①-1警察~~ ①-2市	①-２完了	①-2 横断用黄旗の設置済（R1）	
16	県道金沢吉田線	醍醐字本堂	スクールバスに乗降する際に，道路を渡る必要があるが，道路が広く大型車両も多いため横断が危険である。	横断歩道の新設（押しボタン式信号機があると，なお安全になる。）	警察	完了	横断歩道設置不可。代替策で警察によりミニ看板の設置済。（R4）	

横手市立醍醐小学校　　通学合同点検位置図

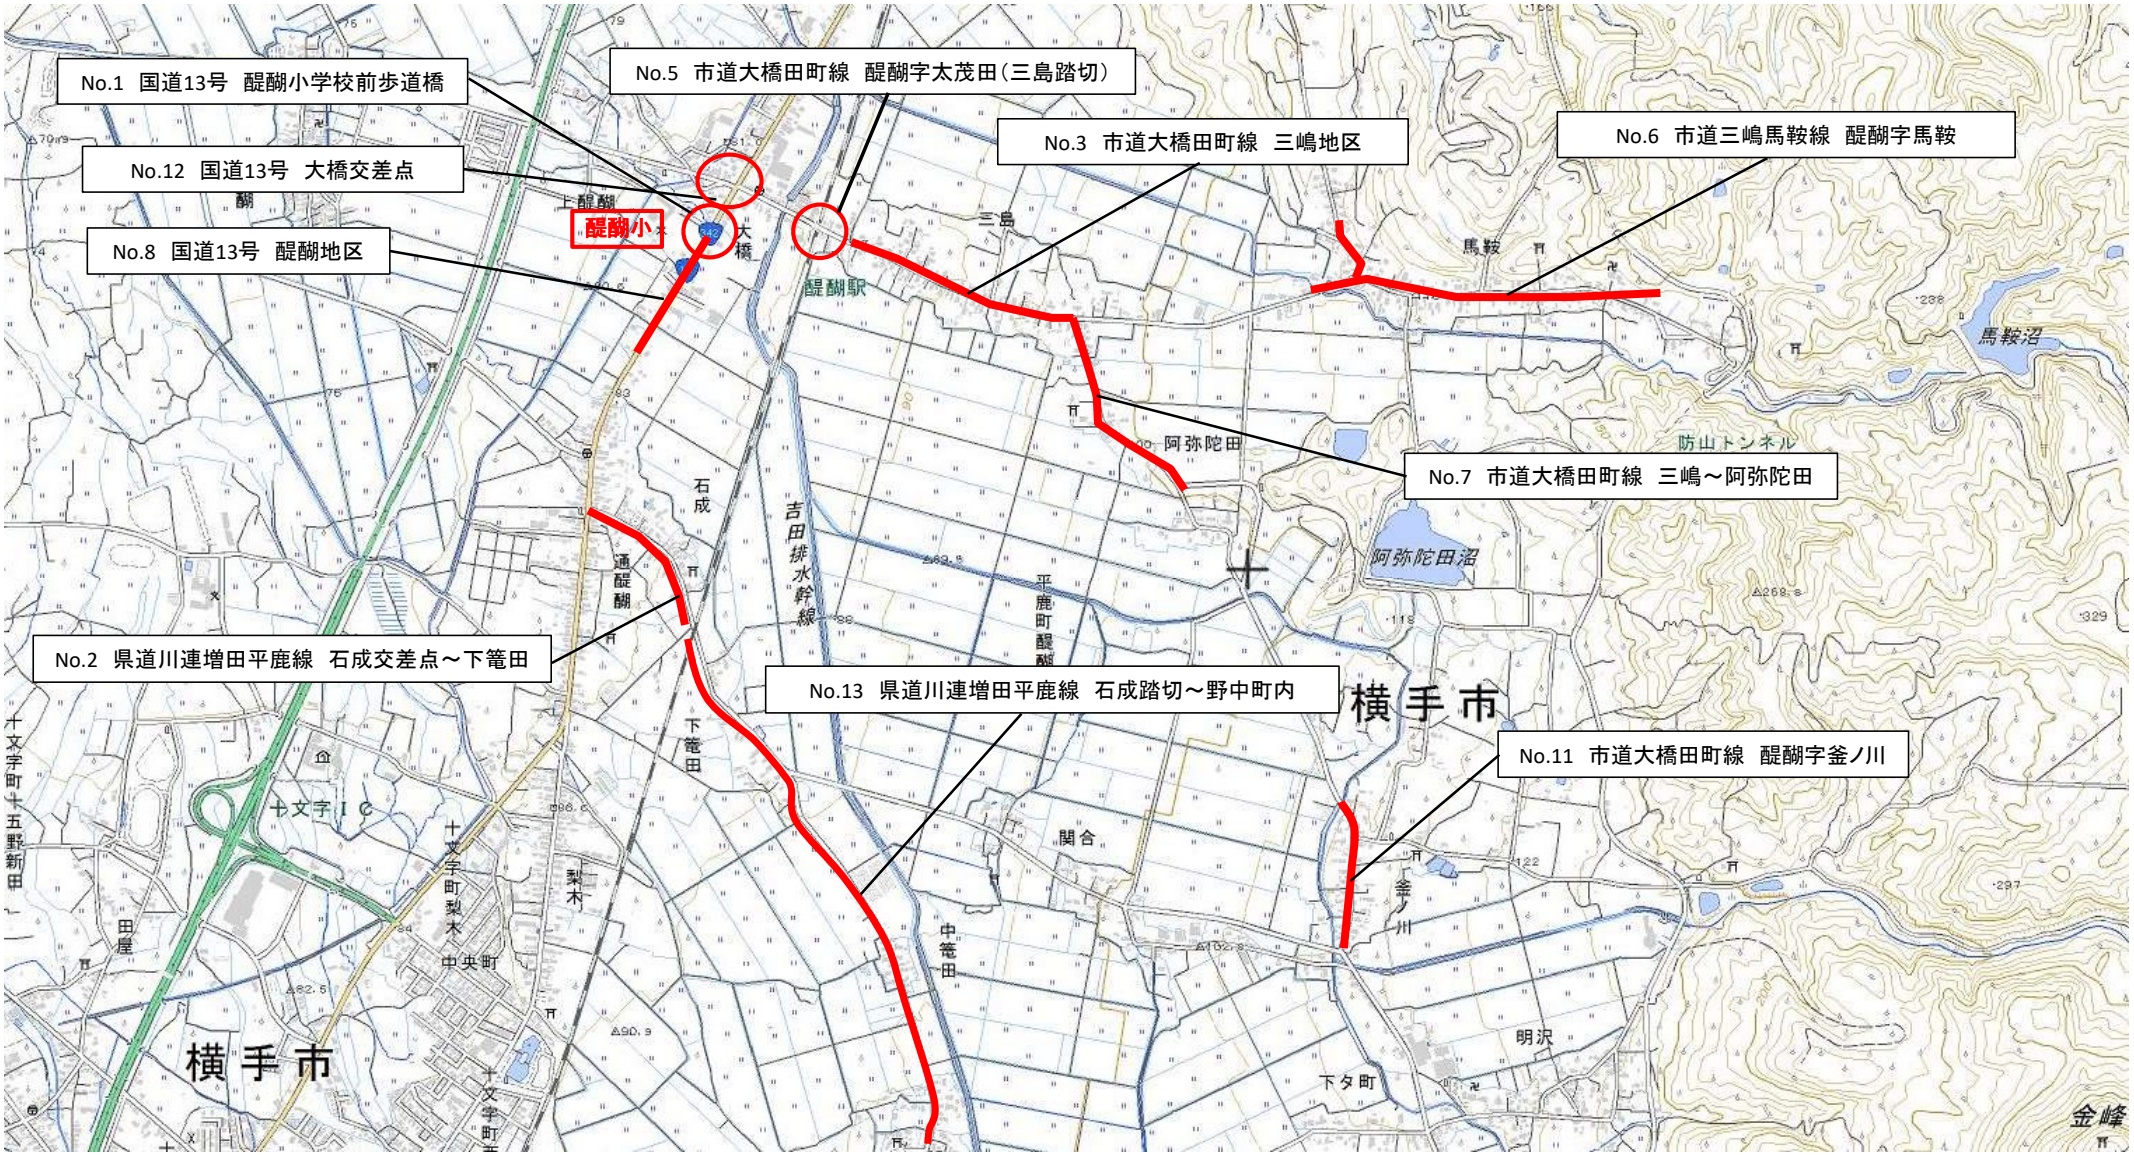

横手市立醍醐小学校　　通学合同点検位置図

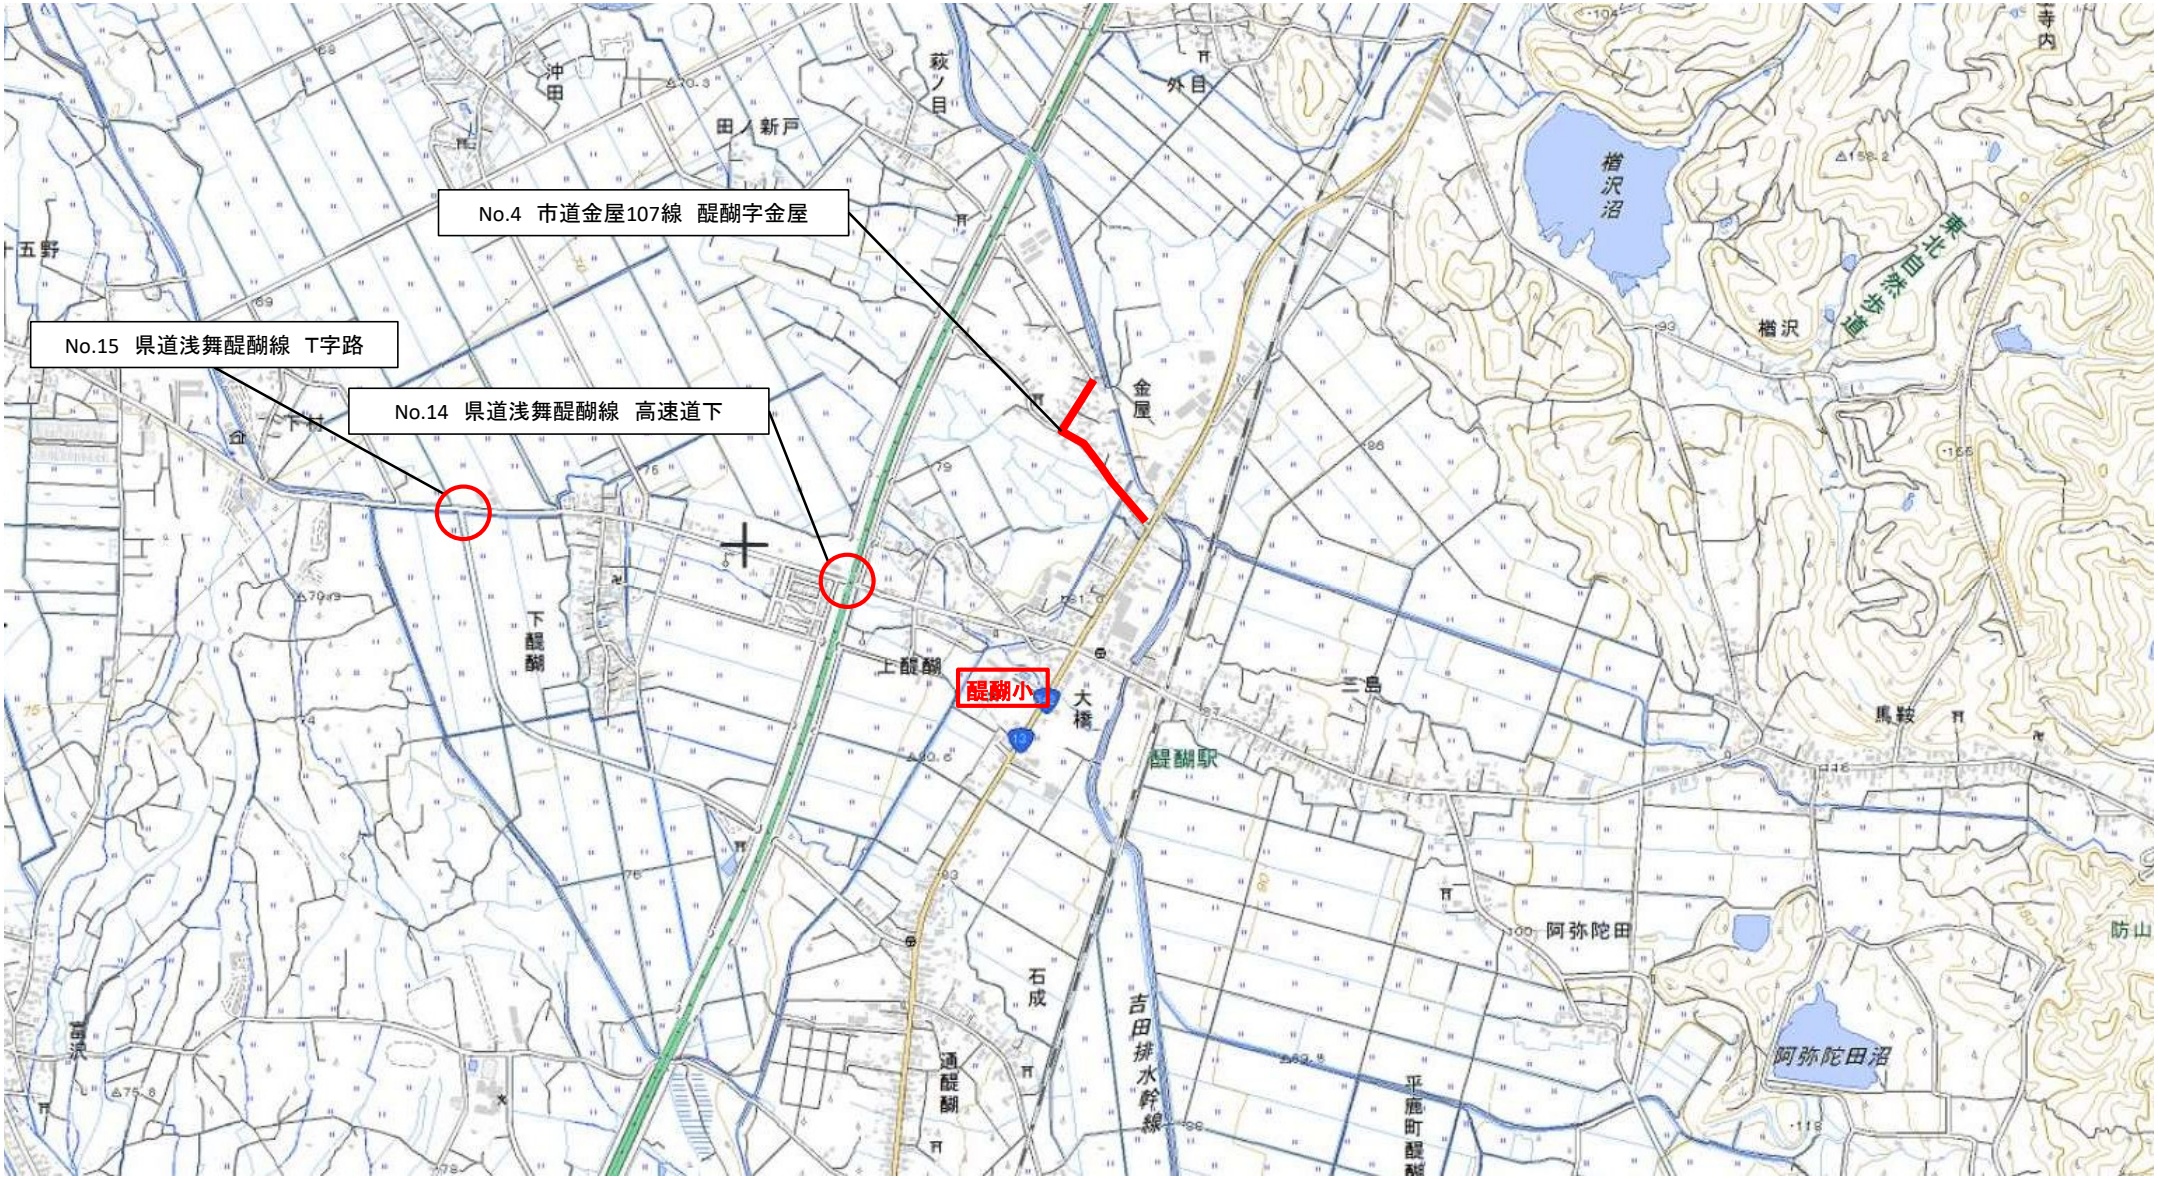

横手市立醍醐小学校　　通学合同点検位置図

