
# 対策一覧表


【大雄小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策要望内容 | 事業主体 | 実施状況 | 実施内容等 | R8以降の予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 県道野崎十文字線 | 大雄字耳取 | 変則のX字形の交差点。<br>スピードを出す車が多く、見通しが悪い。 | ①登下校時の通行の側の検討<br>②通行ルートへの路面標示（ドットライン）の検討<br>③押しボタン式信号機新設 | ①学校<br>②県<br>③警察 | ①実施中<br>②完了<br>③実施なし | ①登下校時の通行側の変更（H27～）<br>②ドットライン設置（H27、R7再塗装済）<br>③実施予定なし | ①継続実施 |
| 2 | 市道折橋四津屋線 | 大雄字三村 | 横断歩道がなく、危険である。<br>道幅が狭く、交差点部分が変則で見通しが悪い。<br>通学児童が渡るための横断舗装がない。<br>路面標示が複数あり、児童には複雑に見える。 | ①横断歩道設置要望<br>②交差点センター部への路面標示（十字マーク）設置検討<br>③わかりやすいように白線・グリーンベルトを引き直す | ①警察<br>②③市 | ①実施なし<br>②完了<br>③完了 | ①実施予定なし<br>②ドットライン設置済（H28）<br>③再塗装実施済（R1） | ①継続要望 |
| 3 | 市道条里跡般若寺線 | 大雄字ハ柏街道添 | 信号のある交差点と、平行している裏道の十字路。<br>スピードを出す車が多く、安全な横断がしづらい。 | ①市道南側への路面標示（グリーンベルト）の設置<br>②児童への交通安全指導（信号機横断歩道の通行） | ①市<br>②学校 | ①完了<br>②実施中 | ①グリーンベルト設置済（R1） | ②継続実施（交通安全指導） |
| 4 | 県道野崎十文字線 | 大雄字新町地内 | ①②スクールバスのバス停に渡るための横断歩道がない。<br>③交通量が多いが道幅が狭いが狭く登下校時危険。 | ①グリーンベルトの設置検討<br>②横断歩道の設置<br>③路幅拡張要望 | ①市<br>②警察<br>③県 | ①完了<br>②検討中<br>③実施中 | ①グリーンベルト設置済（H30）①ドット線設置済（R3） | ②継続要望<br>③バイパス整備中 |
| 5 | 県道大森大内線 | 大雄根田谷地地内 | 時間帯により車の量が大変多い。スピードを出す車が多い。 | 押しボタン式信号機新設 | 警察 | 実施なし | 実施予定なし | 継続要望 |
| 6 | 県道野崎十文字線 | 大雄字ハ柏地内 | 見通しが悪い。スピードを出す車が多い。 | 予告灯付き押しボタン式信号機新設 | 警察 | 検討中 | | 継続要望 |
| 7 | 県道野崎十文字線 | 大雄字ハ柏下村地内 | 歩道と用水路を分ける柵が水路側に傾いている。 | 柵の修繕 | 県 | 完了 | 柵の修繕実施（R3） | |
| 8 | 市道精兵村上田村線 | 大雄字本庄南地内（まつえ食堂前） | 車から歩行者がわかりずらい | 横断者をわかりやすくするため、横断旗、緑色の横断歩道 | 市 | 検討中 | | 継続検討 |
| 9 | 市道根田谷地阿気桜森線 | 桜森地内 | 路幅が狭くカーブが多く、車との接触が心配 | ドライバーに安全運転を意識づける看板の増設、路面に「通学路」の文字入れ | 市<br>地区会議 | 完了 | 「通学路注意」看板の更新と新設（R7地区会議） | |

# 横手市立大雄小学校　　通学路合同点検位置図

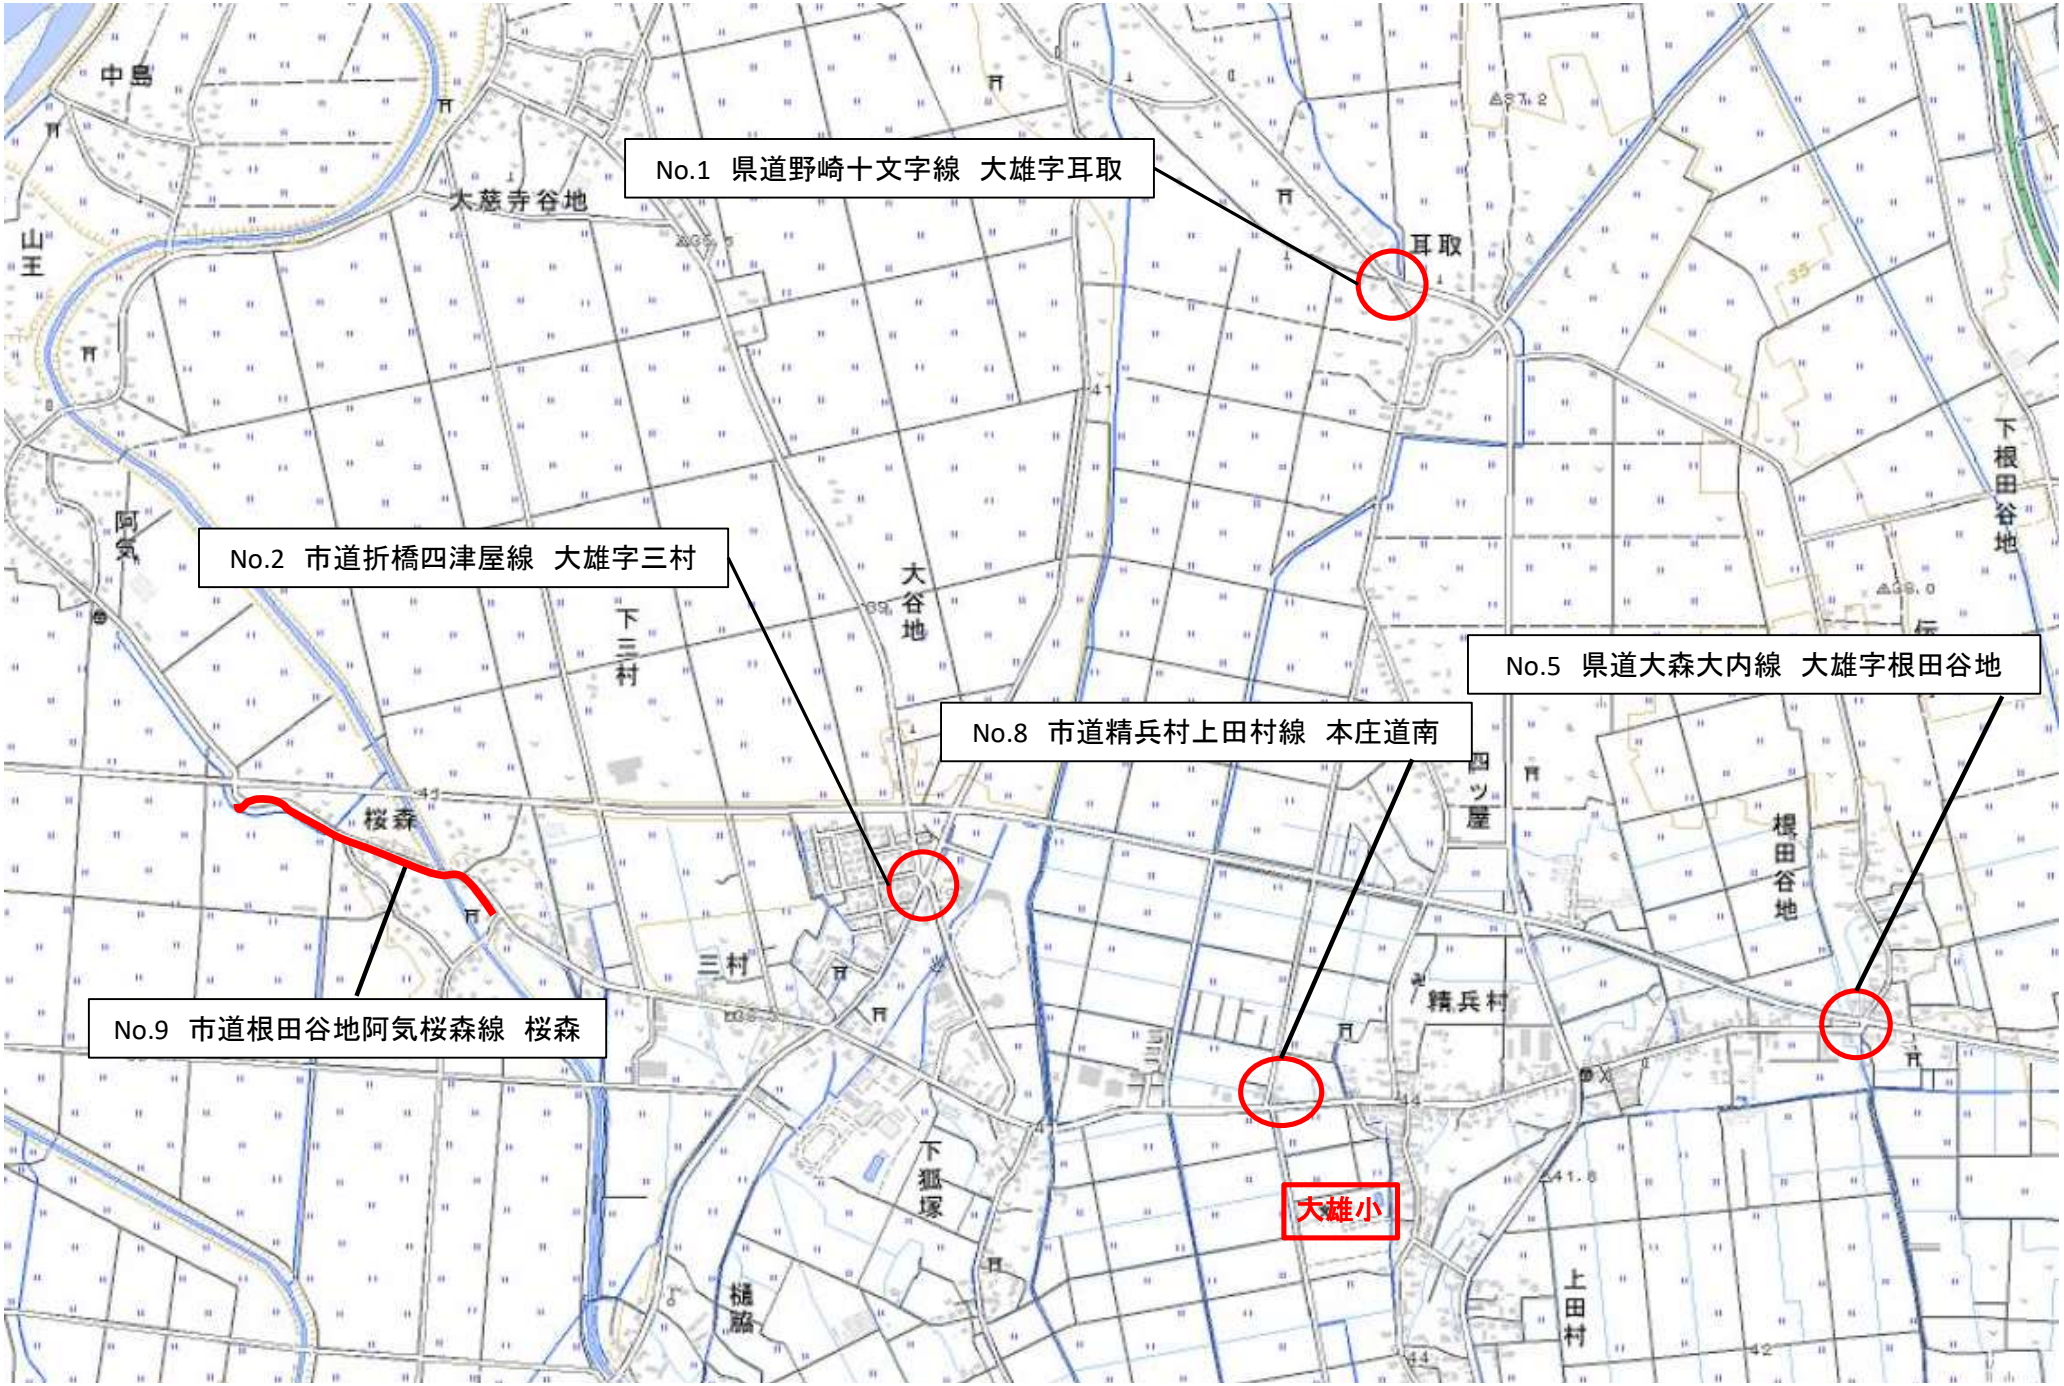

# 横手市立大雄小学校　　通学路合同点検位置図

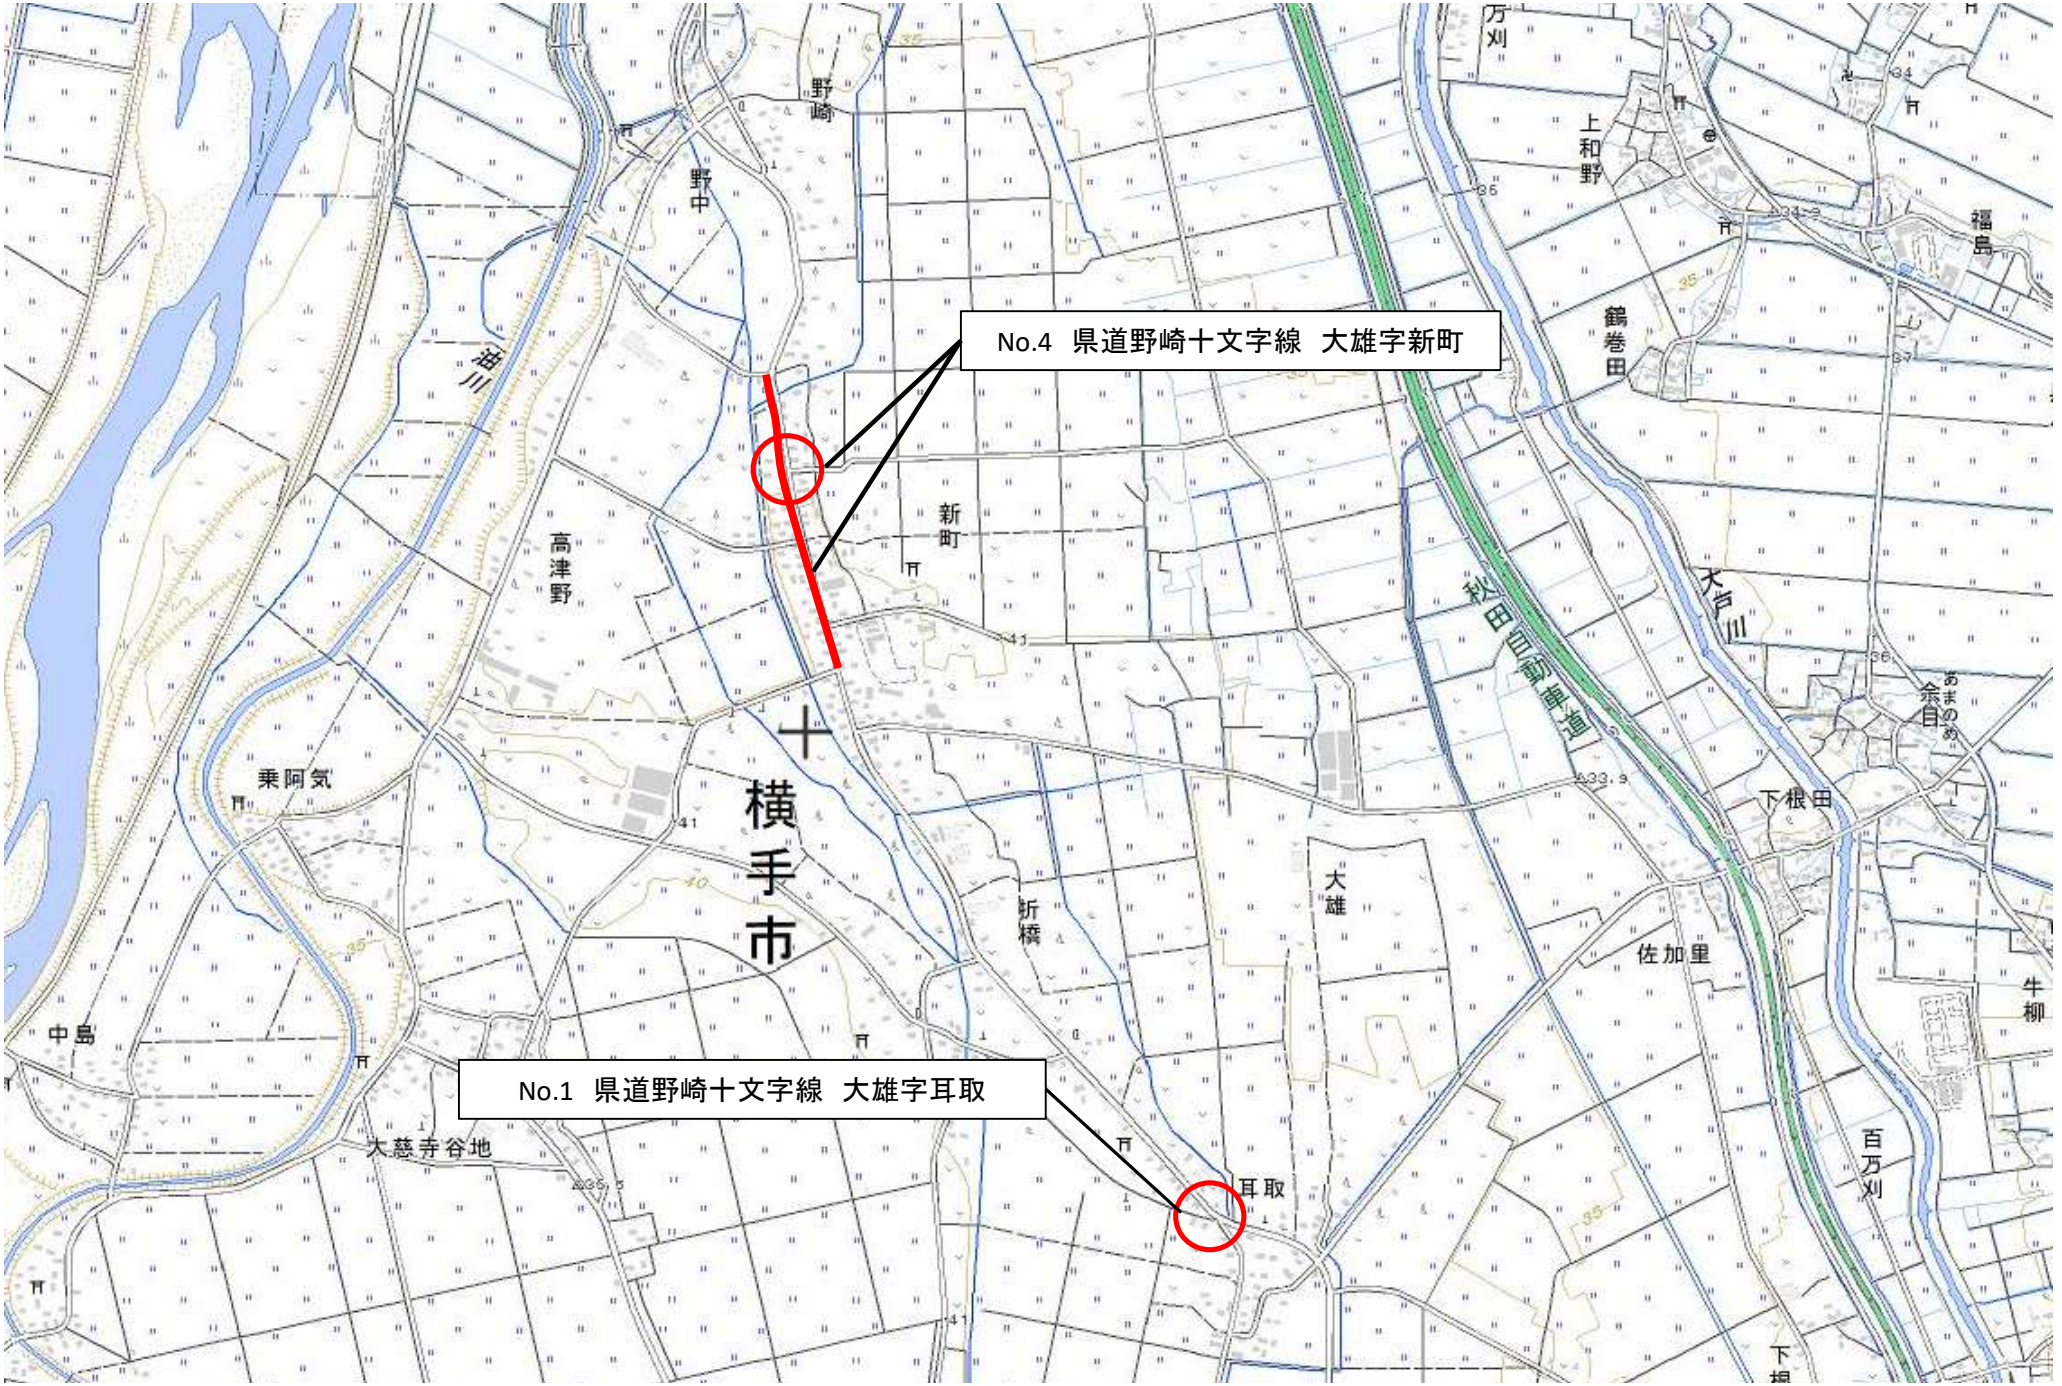

# 横手市立大雄小学校　　通学路合同点検位置図

