

段階確認書

施工予定表

令和3年9月10日

共通仕様書1-1-26に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告致します。

工事名: 市道〇〇線道路改良工事

請負者: 株式会社 横手組

現場代理人: 横手 一郎

種別	細別	確認時期項目	施工確認予定時期	記事
路盤工	下層路盤工	幅員、厚さ、密度	令和3年9月15日	
黄色のセルのみ 入力してください。				

記事欄には受理月日及びサイン等を記入する

通知書

下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知する。

記入しないこと!日

監督員です。

監督員: 山内 太郎

確認種別	確認細別	確認時期項目	確認時期予定日	確認月日	確認者
路盤工	下層路盤工	幅員、厚さ、密度			
記入しない こと!					

確認書

上記種別について、段階確認を実施し確認した。

記入しないこと!日

主任 監督員	監督員	監督員	現場 代理人	主任(監理) 技術者

工事履行報告書

工事名				
工期	令和 3 年 8 月 1 日 ~ 令和 3 年 12 月 5 日			
日付	令和 3 年 12 月 5 日 (月分)			前回提出日を記入する
月 別	予 定 工 程 % ()は工程変更後	実 施 工 程 %	前 回 提 出 日	
8 月	5.5 %	6.4 %	令和3年9月2日	
9 月	27.5 %	20.9 %	令和3年10月4日	
10 月	64.7 % (70.0) %	68.5 %	令和3年11月3日	
11 月	95.6 % (98.0) %	99.8 %	令和3年12月1日	
12 月	100 % (100.0) %	100.0 %	令和3年12月5日	
<ul style="list-style-type: none"> ・実施工程表及び月末時の全景写真(起終点)を必ず添付すること。 ・翌月の5日以内に提出すること。 ・工期が月初めであっても履行報告書を提出すること。 ・予定工程は施工計画書等の計画工程表と合致すること。 ・提出時に工事打合簿は添付しないこと。 				
(記事欄)				

請負者: (株)〇〇建設

主任 監督員	監督員	監督員	現場 代理人	主任(監理) 技術者

課員	
----	--

工事打合簿

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 請負者	発議年月日	令和 年 月 日
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾願 <input checked="" type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 <input type="checkbox"/> その他()		
工事名	令和3年度 市道〇〇線道路改良工事		
(内容)			
使用資材の提出について(〇〇) ←変更及び追加を適宜記入			
土木工事共通仕様書第2-1-1に基づき、使用資材を提出します。			
添付図 葉、その他添付図書			
処 理 ・ 回 答	発注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示・ <input type="checkbox"/> 承諾・ <input type="checkbox"/> 協議・ <input type="checkbox"/> 通知・ <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他() <div style="text-align: right;">令和 年 月 日</div>	
	請負者	上記について <input type="checkbox"/> 了解・ <input type="checkbox"/> 協議・ <input type="checkbox"/> 提出・ <input type="checkbox"/> 報告・ <input type="checkbox"/> 届出 します。 <input type="checkbox"/> その他() 請負者: ㈱〇〇建設 <div style="text-align: right;">令和 年 月 日</div>	

総括 監督員	主任 監督員	監督員	監督員	現場 代理人	主任(監理) 技術者

課員	
----	--

工事打合簿

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 請負者	発議年月日	令和 年 月 日
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾願 <input checked="" type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 <input type="checkbox"/> その他()		
工事名	令和3年度 市道〇〇線道路改良工事		
(内容)			
変更の場合は変更施工計画書と記入する。			
施工計画書の提出について			
土木工事共通仕様書第1-1-7に基づき、施工計画書を提出します。			
添付図 葉、その他添付図書			
処 理 ・ 回 答	発注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示・ <input type="checkbox"/> 承諾・ <input type="checkbox"/> 協議・ <input type="checkbox"/> 通知・ <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他() <div style="text-align: right;">令和 年 月 日</div>	
	請負者	上記について <input type="checkbox"/> 了解・ <input type="checkbox"/> 協議・ <input type="checkbox"/> 提出・ <input type="checkbox"/> 報告・ <input type="checkbox"/> 届出 します。 <input type="checkbox"/> その他() 請負者: ㈱〇〇建設 <div style="text-align: right;">令和 年 月 日</div>	

総括 監督員	主任 監督員	監督員	監督員	現場 代理人	主任(監理) 技術者

横手市長 高橋 大 様

(届出人)

住 所 横手市〇〇町〇〇番地
商号又は名称 株式会社 〇〇建設
代表者氏名 代表取締役 〇〇 〇〇 印

下 請 負 届 (追加)

工事の一部を下請負に付したので、契約事項第8条に基づき届け出します。

1. 工事番号、工事名 DKK031-01 市道〇〇線道路改良工事
2. 工事場所 横手市〇〇町〇〇字〇〇 地内
3. 下請負金額合計 ¥6,234,000 円(消費税含)
下請負金額 ¥1,234,000 円(消費税含)

合計額を記入

4. 内 訳

下 請 負 人			下請工事概要	下請負金額
商号又は名称 代表者名	許可番号	主任技術者名		
(株)〇〇組 横手 三郎	知事(般-14) 第111111号	山内 二郎	管渠工	¥5,000,000
(株)××工業 平鹿 四郎	知事(特-14) 第111111号	増田 一郎	舗装工	¥1,234,000

※ 下請契約書の写し、下請工事内訳書(様式任意)の写しを添付のこと

○ 下請負届の添付書類

- ・下請負届(工事打合簿はいらない)
- ・施工体系図(金額の大小に関係なく必ず添付すること)
- ・施工体制台帳
- ・下請負施工箇所の位置図
- ・建設業の許可証明書(写し)
- ・主任(監理)技術者選任届(写し)
- ・主任(監理)技術者資格証明書及び被保険者証等(写し)
- ・工程表(写し)
- ・下請負金額内訳書(下請負金額の中に工事材料等が含みかどうかわかる書類とする)
- ・下請負契約書及び約款(写し)

※前払金を受理している場合は、契約約款の前払金条項を削除しないこと

横手市長 高橋 大 様

契約者

住 所 横手市〇〇〇町〇〇番地
 商号又は名称 株式会社 〇〇建設
 氏 名 代表取締役 〇〇 〇〇

変更工程表の提出について

次のとおり施工したいので変更工程表を提出します。

- 1. 工 事 番 号 第〇〇〇〇〇〇号
- 2. 工 事 名 令和3年度 市道〇〇線道路改良工事
- 3. 工 事 場 所 横手市〇〇町〇〇字〇〇 地内
- 4. 当 初 請 負 金 額 ¥△△, △△△, △△△. -
 変更後請負金額 ¥△△, △△△, △△△. -
- 5. 工 事 着 手 日 令和3年8月8日
 当 初 工 事 完 成 日 令和3年11月20日
 変 更 工 事 完 成 日 令和3年12月5日

当初と変更がわかるように凡例をつけること。

当初：黒字
 変更：赤字

内 訳 明 細 書

工事内訳	月 日 工事数量	8 月		9 月		10 月		11 月		12 月		月	
		10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
準備工	N=1式	8	18										
	N=1式	8	18										
土工	N=1式		18		25								
	N=1式		18		30								
排水構造物工	L=80.2m			1			15						
	L=107.2m				20		30						
路盤工	A=1,000㎡						15		15				
	A=990㎡						1		25				
舗装工	A=1,000㎡						20		20				
	A=990㎡						1		30				
後片付	N=1式							15	20				
	N=1式							1	5				

変更工程表を提出する際は、凡例を付け色分けして(黒・赤)当初と変更が判別できるように記入すること。

使用資材の提出について

主任監督員 山内 花子 様

主任監督員宛で提出！

請負者住所 横手市十文字町字海道下7番地
商号又は名称 株式会社 十文字組
氏 名 代表取締役 十文字 太郎

このことについて、下記事項を提出します。

1. 事業名 生活基盤道路整備事業
2. 年度 令和3年度
3. 工事名 令和3年度 市道〇〇線道路改良工事
4. 路線、河川名 市道〇〇線
5. 工事場所 横手市十文字町字海道下 地内
6. 使用資材名

品名	形状・寸法	製造会社又は工場名	綴No.	備考
落蓋側溝	300A L=2,000mm	十文字コンクリート(株)	No. 1	
勾配可変側溝	B400×H600 L=2,000mm	横手ブロック(株)	No. 2	
コンクリート蓋	B400(T-25) L=500mm	〃	No. 2	
開閉式グレーチング蓋	B400(T-20) L=1,000mm	山内鉄工(株)	No. 3	
再生クラッシャーラン	RC-40	大雄碎石	No. 4	
粒度調整碎石	M-40	〃	No. 4	
生コンクリート	18-8-40 BB W/C ≤ 60%	雄物川コンクリート(株)	No. 5	
アスファルト混合物	再生②密粒度As(13)	雄物川道路(株) 大森合材工場	No. 6	
			No.	
			No.	
			No.	
			No.	

使用資材を綴る際、インデックスを貼りその番号と合致すること！

安全掲示板等確認表

種別	名称	確認事項	確認欄
法律規則等で掲示が定められている標識看板	①建設業の許可票	・500万円以上の下請業者も掲示しているか。 ◇2500万円以上は専任(下請も同じ)。	○
	②労災保険関係成	・労災保険関係成	○
	③施工体系図	・現場の見やすい場所に掲示されているか。	○
	④作業主任者	・現場の見易い場所に掲示されているか。 ・氏名、職務及び複数を選任する場合はその分担を標示しているか。 ◇数が多い場合は職務を併記した一覧表でも可。	○
	⑤安全衛生推進者等	・安全衛生推進者(衛生推進者)を専任している場合は掲示しているか。 ◇事業規模10~50人	○
進ずる標識看板	⑥建設業退職金共済制度 適用事	・現場の見易い場所に掲示されているか。	○
	⑦工事名標示板	・現場の見易い場所に設置しているか。	○
	⑧建設リサイクル届出	・現場の見易い場所に貼付し 隠さない場所に貼付し	○
安全標識	⑨有資格者一覧表	・現場の見易い場所に掲示されているか。 要とする業務に従事する者を標示しているか。	○
	⑩緊急時連絡表	・現場の見易い場所に掲示されているか。	○
その他掲示が望ましいもの	⑪安全スローガン	・現場の見易い場所に掲示されているか。	—
	⑫無災害記録表	・現場の見易い場所に掲示されているか。	—
	⑬作業予定表(お知らせ)	・現場の見易い場所に掲示されているか。	○
	⑭危険予知活動	・現場の見易い場所に掲示されているか。	○
	⑮その他労働安全に関する事項	・現場の見易い場所に掲示されているか。 ◇ワイヤーロープの使用禁止基準、玉掛ワイヤーの点検等	—

施工体系図は下請負契約をしていない場合でも掲示すること。

契約日から概ね2週間以内に
工事打合簿で提出すること。
写真は全景の他、掲示物毎に
撮影し添付すること。

※上記確認欄に、掲示済の場合は『○』、該当しない場合は『—』を全て記入し工事打合簿で監督職員へ提出すること。提出にあたっては、掲示済みの掲示板を撮影し当該確認表に添付すること。

※原則的に①~⑩までについては全ての工事現場で掲示する。(④⑤⑧は該当工事)

※その他労働安全に有効と思われる看板等を掲示をすること。。

市道〇〇線道路改良工事

DKK031-01

変更施工計画書

変更契約をした月日
以降の月を記入する
こと。

令和3年9月

株式会社 〇〇建設

目 次

・変更施工計画書作成時は、表紙及び目次以外は変更箇所のための提出でもよい。

1. 工事概要	1
2. 計画工程表	2
3. 現場組織表	3~4
4. 指定機械	5
5. 主要船舶・機械	6
6. 主要資材	7~11
7. 施工方法(仮設備計画、工事用地等を含む)	12~20
8. 施工管理計画	21~30
9. 安全管理	31~32
10. 緊急時の体制及び対応	33~38
11. 交通管理	39~42
12. 環境対策	43
13. 現場作業環境の整備	44
14. 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法	45~46
15. その他	47

変更した項目については赤字
で記入

第1章 工事概要

当初:黒字
変更後:赤字

工事名 令和3年度 市道〇〇線道路改良工事

工事場所 横手市〇〇町〇〇字〇〇 地内

工期 自 令和3年6月1日
至 令和3年11月11日
令和3年11月26日

凡例を付け当初と変更がわかるようにすること。


請負金額 ¥42,000,000
¥44,100,000
(内消費税) (¥2,000,000)
¥2,100,000

発注者 横手市建設部 建設課
Tel 0182-32-2407

請負者 株式会社 〇〇組
Tel 0182-〇〇-〇〇〇〇

工事内容	・総延長	L=780.00m L=740.20m
	・勾配可変側溝 B400×H600	L=107.20m L=658.50m
	・落蓋側溝 B300	L=658.50m L=613.40m
	・視線誘導標	N=23箇所 N=20箇所
	・集水枡 B600×H800	N=4箇所 N=2箇所
	・表層工 再生②密粒度AS(13)	A=100.0m ² A=120.0m ²
	・区画線工 ペイント式 外側線	L=150.0m L=120.0m
	・付帯工	N=1式

○工事標示板の様式

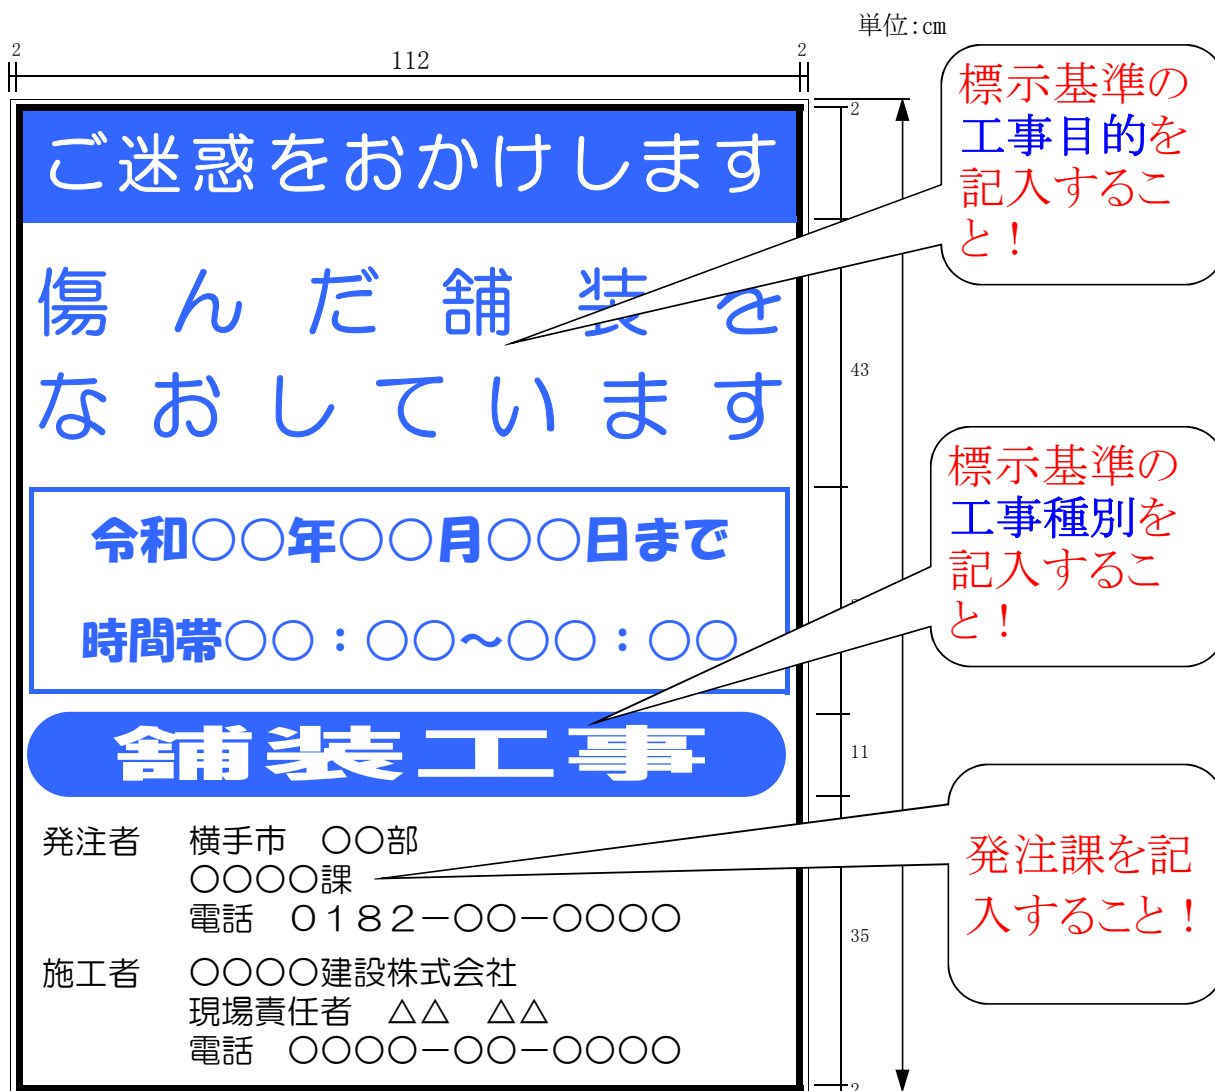

1. 「ご迷惑をおかけします」「〇〇〇〇工事」は青地に白抜きとし、反射装置を施したものとする。
2. 「〇〇〇〇を行っています」等の工事内容、工事期間については青色文字、その他の文字及び線は黒色、地を白色とする。
3. 縁線の余白は2cm、縁線の太さは2cmで黒色とする。
4. 工事期間等に変更があった場合は、直ちに修正するものとする。
5. 文字サイズ、レイアウトは記載内容に応じて調整するものとする。
6. 作成にあたっては、監督職員と協議のうえ作成すること。

工事標示板標示基準

区分	主な工種	工事種別	工事目的（表示例）
土木関係	舗装工事	舗装工事	傷んだ舗装をなおしています
		舗装新設工事	舗装した道路をつくっています
		舗装改修工事	傷んだ道路をなおしています
	歩道工事	歩道舗装工事	傷んだ歩道部の舗装をなおしています
		歩道舗装新設工事	舗装した歩道をつくっています
		歩道舗装改修工事	傷んだ歩道をなおしています
	道路改良工事	道路改良工事	傷んだ道路をなおしています
		道路新設工事	新しい道路をつくっています
		歩道改良工事	傷んだ歩道をなおしています
		歩道新設工事	新しい歩道をつくっています
	道路維持工事	局部改良工事	〇〇をつくって(なおして)おります
		側溝改良工事	古くなった側溝を新しくしています
		道路維持工事	傷んだ〇〇(ガードレール、標識等)をなおしています
	橋梁工事	橋梁下部工工事	新しい橋の〇〇(橋台、橋脚)をつくっています
		橋梁上部工工事	新しい桁を架けています
		橋梁仮設工事	仮橋をつくっています
		橋梁補修工事	古くなった橋をなおしています
		橋梁架替工事	古くなった橋を新しくしています
		歩道橋架替工事	古くなった歩道橋を新しくしています
	河川工事	浚渫工事	川の浚渫を行っています
護岸工事		護岸をつくって(なおして)おります	
公園工事	公園工事	〇〇(園路、駐車場、広場等)をつくっています 遊具の新設を行っております	
	公園改修工事	傷んだ〇〇(園路、遊具、駐車場等)をなおしています	
	防火貯水槽工事	防火貯水槽工事	防火貯水槽の新設を行っております
	照明灯改修工事	照明灯改修工事	古くなった照明灯を新しくしています
水道関係	供給関連工事	水道工事	水道管の〇〇(新設・取替・撤去等)を行っています 地震に強い水道管に取り替えています
	新設(増設・取替・撤去)工事		
	修繕・補修工事		水道管の修理を行っています
	配水管工事		水道管の移設を行っています
	支障移設工事		埋設物の調査を行っています
	埋設物調査工事		緊急で水道管の水漏れをなおしています
	緊急工事		水道管の点検・修理を行っています
	点検・補修工事		水道管の埋設跡の復旧を行っています
	舗装復旧工事		
下水道関係	新設(増設・取替・撤去)工事	下水道工事	下水道管の〇〇(新設・取替・撤去等)を行っています
	(浸水対策・耐震)工事		下水道管の浸水対策を行っています 下水道管の耐震化を行っています
	修繕・補修工事		下水道管の修理を行っています
	支障移設工事		下水道管の移設を行っています
	埋設物調査工事		埋設物の調査を行っています
	緊急工事		緊急で水道管の水漏れをなおしています
	点検・補修工事		下水道管の点検・修理を行っています
	舗装復旧工事		下水道管の埋設跡の復旧を行っています
	浄化槽工事		浄化槽工事

※工事標示板を作製する際は、監督職員に記載内容(工事種別・工事目的等)について確認を得ること。
